



# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

## VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Área:	Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.:	UNCA/VRAD/E-086/2022.
Asunto:	Informe trimestral del FAM 2021.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 08 de abril de 2022.

**DOCTOR**

**EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ**

DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL "DGESUI"

P R E S E N T E:

En atención al oficio número: 511/2021.-0504-34 signado con fecha 16 de febrero de 2021 y por instrucciones del Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector de la Universidad de la Cañada; por este conducto me permito remitirle el Informe de Avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2021, correspondiente al trimestre enero-marzo, con fecha corte 31 de marzo de 2022, debidamente requisitado y digitalizado en formato PDF con sus respectivos archivos en Excel.

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formatos Excel y PDF a los correos: rocioc@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx

Así mismo, se hace llegar las Actas de Finiquito y actas de Entrega-Recepción en los formatos correspondientes, de las obras No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

*"praeteritum noscere, posterum molior"*

**L.C.E. Alfonso Martínez López**

**Vice-Rector de Administración** Universidad de la Cañada



**VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

Con copia para:

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ. - Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.  
DR. FRANCISCO LUCIANO CONCHEIRO BÓRQUEZ.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento.  
DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA.- Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural "DGESUP".- Mismo fin.  
M.A. MAGALY NICTEXA FIERRO MUÑOZ.- Representante Institucional UNCA.- Mismo fin.  
ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL.- Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.- Mismo fin.  
Archivo.

2021



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**ENE-MAR/2022**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2022

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de la Cañada**

Entidad federativa: **Oaxaca**

Código Inst 011\_20/UAU032V

RESPONSABLES

Función	Copias/Mantenimiento
Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ	Nombre: ARI. MELANY CUEVAS MARTEL
Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN	Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Teléfono: (238) 372 07 15, Ext.: 203	Teléfono: (238) 372 07 15, Ext.: 203
Correo electrónico: vica_admin@unca.edu.mx	Correo electrónico: supervision-obras@unca.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Cuenta con Actas					
		Obras de construcción	Equipamiento	Adornamientos y mejoras	Mantenimiento				Proyectos sustentables	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta físico)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X				\$ 2,771,500.00	\$ 2,771,500.00	\$ -	ÁREA DE JUEGOS	1	510.00	CONTRAFLEABROS, CONTRASIENTO S, CANAL FLUYRAL, LAMINA MULTITECHO, CISTERNA DE ALMACEN FLUYRAL Y PRIMERA ETAPA DE BAÑOS VESTIDORES.		100%	16/08/21	23/11/21	OBRA CONCLUIDA.	NO, AUN FALTA LA TERMINACIÓN DE LOS BAÑOS-VESTIDORES.	-	-	SI	SI	\$ 2,771,500.00	
									ÁREA DE SEGURIDAD LIBRE DE OBSTACULOS	1	102.00													
									ÁREA DE GRADAS O ESPECTADORES	1	63.00													
									ÁREA DE BANCO DE JUGADORES Y MESA DE CONTROL	1	35.00													
TOTAL	4	710.00																						
2	REEMPLAZO DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS TECNOLOGÍA LED EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.		X			\$ 300,124.05	\$ 300,124.05	\$ -	ESPACIO EDUCATIVOS	12 EDIFICIOS	0.00	SUMINISTRO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS		100%	15/12/21	09/02/22	CONCLUIDO.	NO, UNA VEZ SUMINISTRADOS LOS BIENES FALTA LA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS.	-	-	SI	SI	\$ 300,124.05	
									TOTAL	12 EDIFICIOS	0.00													
									ESPACIO EDUCATIVOS	4 EDIFICIOS	0.00													
									TOTAL	4 EDIFICIOS	0.00													
3	EQUIPAMIENTO DE AULAS GENERALES, INTERACTIVA Y AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X				\$ 661,827.79	\$ 661,827.79	\$ -	AILAS Y AUDITORIO	2 EDIFICIOS	0.00	INSTALACIÓN DE EQUIPOS		100%	06/12/21	16/12/21	OBRA CONCLUIDA	SI	-	-	SI	SI	\$ 661,827.79	
									TOTAL	2 EDIFICIOS	0.00													
									TUBO PVC CONDUMT	69 PIEZAS	0.00													
									INTERRUPTORES PARA LUZ	2	0.00													
PONCHADORA HERMÉTICA	1	0.00																						
CABLE DE ALUMINIO Y CABLE DE CROMADO	250 Y 16 MTS	0.00																						
TOTAL	69 PIEZAS	0.00																						
4	ADECUACIÓN Y MEJORA DEL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X				\$ 269,029.00	\$ 269,029.00	\$ -	ADECUACION	1 EDIFICIO	0.00	FORJADO DE ESCALÓN Y CLOUADO DEL MISMO, REUBICACIÓN DE SILLAS EXISTENTES Y NUEVAS, PINTURA EN ESCALONES Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA		100%	20/09/21	14/11/21	OBRA CONCLUIDA	NO, SOLO SE TRATA DE LA ADECUACIÓN DE UN EDIFICIO EXISTENTE.	-	-	SI	SI	\$ 269,029.00	
									TOTAL	1 EDIFICIO	0.00													

2021

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**ENE-MAR/2022**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Institución: **Universidad de la Cañada**  
Entidad federativa: **Oaxaca**  
Código Inst 911: 20MSU0032V

RESPONSABLES

Función	Códe y Mantenimiento
Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Teléfono: (231) 372 07 15, Ext: 200 Correo electrónico: vice_admin@unca.edu.mx	Nombre: ARQ. MELANY CUEVAS MAMEL Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Teléfono: (231) 372 07 15, Ext: 203 Correo electrónico: supervision-obras@unca.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas?)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas				
		Obras de urbanización	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustantivo	Especie/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta físico)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa	
																									Cuenta con Actas
5	EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X				\$ 343,335.69	\$ 343,335.69	\$ -	BIBLIOTECA	1	EDIFICIO	-	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS MESAS			100%	05/11/21	04/12/21	OBRA CONCLUIDA.	SI	-	-	SI	SI	\$343,335.69
GLOBAL DEL PROYECTO																									
									TOTAL	1	EDIFICIO	0.00													
6	AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.					\$ 4,223,000.00	\$ 4,223,000.00	\$ -	SALA DE LECTURA PLANTA BAJA	1	143.00		Muros de tabique en segundo nivel. ESTRUCTURA DE ACERO EN AZOTEA CON MUYLTY TECH Y ACABADOS			100%	23/08/21	28/02/22	OBRA CONCLUIDA.	SI	-	-	SI	SI	\$4,223,000.00
GLOBAL DEL PROYECTO																									
									SALA DE LECTURA PLANTA ALTA	1	160.00														
									ÁREA DE ESCALERAS	1	10.00														
									PASILLO DE INTERCOMUNICACIÓN	1	10.00														
									TOTAL	1	325.00														
7	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA		X			\$ 4,597,651.24	\$ 4,597,651.24	\$ -	CUARTO DE INVERSORES	1	13.33		INSTALACION DE ESTRUCTURA, MODULOS FOTOVOLTAICO S Y CERCADO			100%	01/10/21	22/01/22	OBRA CONCLUIDA.	SI	-	-	SI	SI	\$4,597,651.24
									JARDIN SOLAR	1	682.00														
									TOTAL	2	695.33														
						\$13,516,330.69	\$13,516,330.69	\$0.00																	

DR. RAÚL SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. MELANY CUEVAS MAMEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todos los datos de dd, mm y aa.



Universidad de la Cañada  
RECTORÍA



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

**100%**

PRIOIDAD **1** Nombre de la obra: **TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

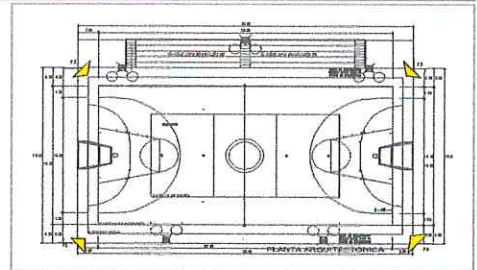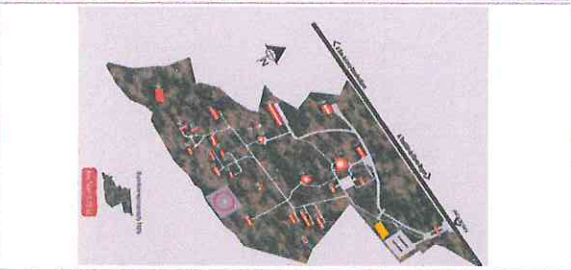

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatlipan Km. 1.7, Paraje Titlacuatlan, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: BAÑOS VESTIDORES 1A ETAPA



F2: OBRA CONCLUIDA

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: OBRA CONCLUIDA



F4: OBRA CONCLUIDA



F5: OBRA CONCLUIDA

DR. MODESTO SEARA RODRIGUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. MELANI CUEVAS MANUEL  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una lista de fotografías que se copiarán en el informe. Se recomienda que se capture la imagen antes, durante y después de la obra. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la imagen antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**ENE-MAR/2022**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada



Porcentaje de avance

**100%**

PRIMORDIAL 2

Nombre de la obra: **REEMPLAZO DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS TECNOLOGÍA LED EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

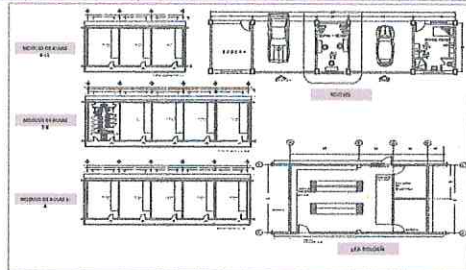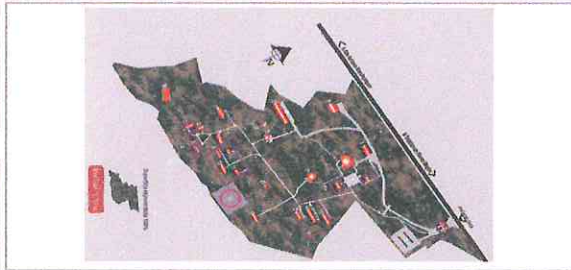

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlán- San Antonio Nonsahuatlipan Km. 1.7, Paraje Tilacuabilla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: INSTALACION DE LAMPARAS EN VICE-RECTORÍA DE ADMON.



F2: INSTALACION DE LAMPARAS EN AULAS

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: SUMINISTRO DE LAMPARAS



F4: SUMINISTRO DE LAMPARAS



F5: SUMINISTRO DE LAMPARAS

DR. MOGOSTO BERRA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

PROF. DELANY CUEVAS MANUEL  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaina, se podrá anexar tantas fotografías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, misma hora y mismo día antes, durante y después de la obra.

2021

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**ENE-MAR/2022**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance



**100%**

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra: **EQUIPAMIENTO DE AULAS GENERALES, INTERACTIVA Y AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

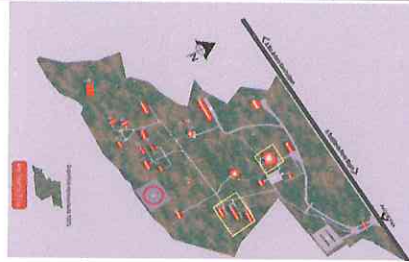

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatlpan Km. 1.7; Paraje Tlalacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: SMART TV EN AULAS



F2: SMART TV EN AULAS

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: PROYECTOR EN AUDITORIO



F4: PROYECTOR EN AUDITORIO



F5: PROYECTOR EN AUDITORIO

DR. MODESTO SEARA VARGOZ

Nombre y firma del Titular de la IES

AVO. MEDRY CUEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, en especial, se recomienda que se capture la misma en tres momentos: antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2021

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**ENE-MAR/2022**

FECHA DE CORTE: 31/03/2022



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

4

Nombre de la obra: **ADECUACIÓN Y MEJORA DEL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

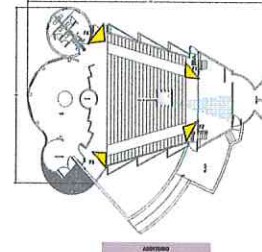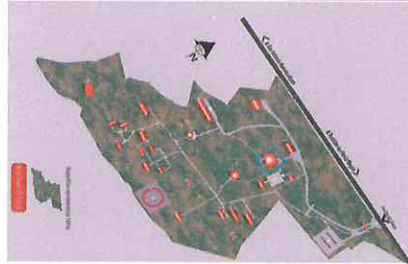

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Tectitlan- San Antonio Nanhualtipan Km. 1.7; Paraje Tilacuatita, Tectitlan de Flores Magón Oaxaca.



Porcentaje de avance

**100%**

FOTOS



F1: MONTAJE DE BUTACAS



F2: MONTAJE DE BUTACAS


Comentarios de los trabajos realizados:



F3: MONTAJE DE BUTACAS



F4: MONTAJE DE ALFOMBRA

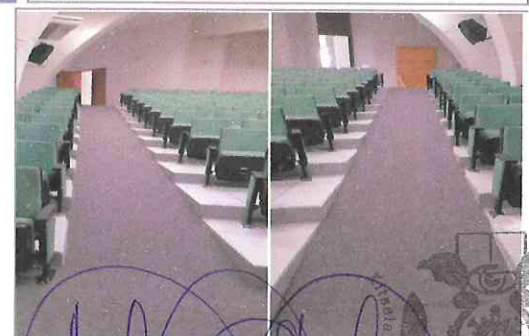

F5: MONTAJE DE ALFOMBRA

DR. MODESTO GARRA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ARG. MELANY CUEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, en la que se podrán copiar tantas fotografías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2021

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**ENE-MAR/2022**

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

**100%**

PRIORIDAD **5**

Nombre de la obra: **EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

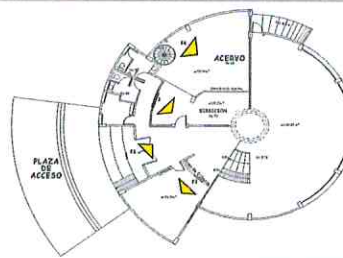

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7, Paraje Titlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: SUMINISTRO DE SILLAS



F2: SUMINISTRO DE SILLAS

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: SUMINISTRO DE MESAS DE TRABAJO



F4: SUMINISTRO DE MESAS DE TRABAJO



F5: SUMINISTRO DE MESAS DE TRABAJO

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ARG. MELANY CUEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una postal, en la que se capture la misma postal como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adiciones, en especial, se recomienda que se capture la misma postal en el mismo lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



2021

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**ENE-MAR/2022**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada


Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD 6

Nombre de la obra: **AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

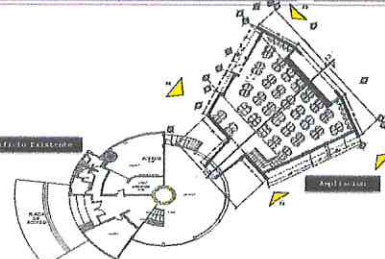

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km 1.7, Paraje Tilacuautilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: FACHADA NORTE



F2: PERSPECTIVA


Comentarios de los trabajos realizados:



F3: PERSPECTIVA



F4: FACHADA PONIENTE

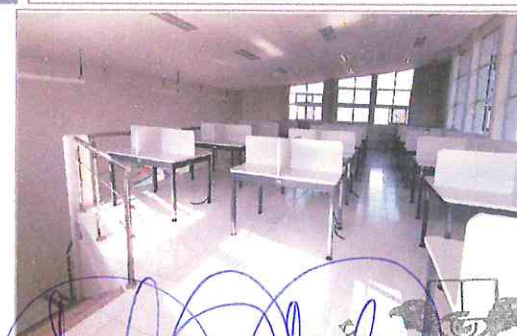

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ARO MELANI GUEVAS MANZEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pequeña fotografía de cada una de las etapas de las obras, así como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma de cámara en el mismo lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2021

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**ENE-MAR/2022**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada


Porcentaje de avance

**100%**

PRIOIDAD **7**

Nombre de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuasipan Km. 1.7, Paredo Tiliacuatlla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS




F1: CABETA DE INVERSORES



F2: ÁREA DE JARDÍN SOLAR

Comentarios de los trabajos realizados:

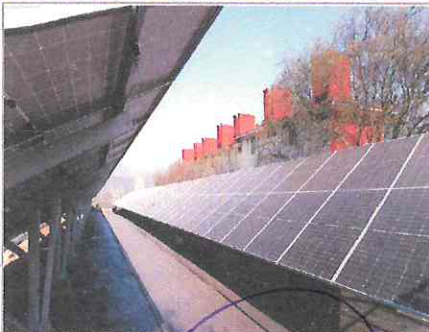

F3: ESTRUCTURA



F4: ÁREA DE JARDÍN SOLAR



F5: VISTA ÁREA DE JARDÍN SOLAR

DR. MODESTO SEARA YAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES



PROF. MELANY CLEVAS MARTEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una fotografía de cada una de las etapas de la obra, así como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma en tres momentos: antes, durante y después de la obra.
