



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Área:	Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.:	UNCA/VRAD/E-087/2022.
Asunto:	Informe trimestral del FAM 2022.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 08 de abril de 2022.

DOCTOR

EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ

DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL "DGESUI"

P R E S E N T E:

En atención al oficio número: 511/2022-0826-37 signado con fecha 18 de febrero de 2022 y por instrucciones del Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector de la Universidad de la Cañada; por este conducto me permito enviarle el Informe de Avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2022, correspondiente al trimestre enero-marzo, con fecha corte 31 de marzo de 2022, debidamente requisitado y digitalizado en formato PDF con sus respectivos archivos en Excel.

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formatos Excel y PDF a los correos: rocioc@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

"praeteritum noscere, posterum molior"

L.C.E. Alfonso Martínez López
Vice-Rector de Administración



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
**VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN**

Con copia para:

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ. - Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.

DR. FRANCISCO LUCIANO CONCHEIRO BÓRQUEZ.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento.

DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA.- Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural "DGESUI".- Mismo fin.

M.A. MAGALY NICTEXA FIERRO MUÑOZ.- Representante Institucional UNCA.- Mismo fin.

ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL.- Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.- Mismo fin

Archivo.

2022



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTRUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTRUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ENE-MAR/2022
FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Cañada

Entidad federativa: Oaxaca

Código Inst 911: 2064330012V

RESPONSABLES

Planesión
Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Teléfono: (236) 372 07 15, Ext. 200
Correo electrónico: vice_admin@unca.edu.mx


Obras y Mantenimiento
Nombre: ARG. MELANY CUEVAS MARQUEL
Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Teléfono: (236) 372 07 15, Ext. 204
Correo electrónico: supervisionobras@unca.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada			
		Obras de construcción	Equipamiento	Afectaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto puntualizable	Especie/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.					\$ 6,664,029.00	\$ -	\$ 6,664,029.00	Sistemas Integrados de Distintos	1	60.30	GLOBAL DEL PROYECTO	0%	-	-		NO	-	-	NO	NO	60.00
		Rodas	1	82.30																		
		Eléctrica	1	63.40																		
		Vestíbulo de acceso y área de Técnico	1	74.60																		
		Sanitarios	1	10.10																		
		Comedor	1	14.30																		
		Investigación de Desarrollo de Software	1	90.20																		
		Área Ux	1	86.00																		
		Innovación Educativa	1	78.00																		
		Vestibulo	1	78.80																		
		TOTAL	10	670.00																		
2	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.					\$ 2,801,165.00	\$ -	\$ 2,801,165.00	Herrería, albañilería y jardinería	1	21.40	GLOBAL DEL PROYECTO	0%	-	-		NO	-	-	NO	NO	60.00
		Bodega de Materiales	1	39.20																		
		Vestibulo	1	49.00																		
		Área de Intendencia	1	16.50																		
		Oficina DPCM	1	25.10																		
		Instalaciones/ Choforos	1	19.70																		
		Carpintería	1	21.00																		
		Servicio de Comedor	1	18.10																		
		Área de Trabajo	1	69.40																		
		Lavaderos	1	2.60																		
		Sanitarios	1	21.50																		
TOTAL	11	322.00																				

Nombre y firma del Titular de la IES
DR. MODESTO SEARA RODRÍGUEZ



Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
ARG. MELANY CUEVAS MARQUEL

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Universidad de la Cañada
RECTORÍA

1 Se separaran los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte de avance.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ENE-MAR/2022
FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada



Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD **1**

Nombre de la obra: **CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

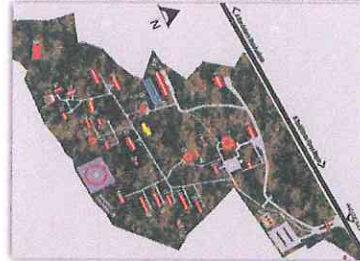

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7, Paraje Titlacuatilla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: SUPERFICIE A CONSTRUIR



F2: SUPERFICIE A CONSTRUIR

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: SUPERFICIE A CONSTRUIR



F4: SUPERFICIE A CONSTRUIR



F5: SUPERFICIE A CONSTRUIR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

PROF. MELANY CUEVAS MARTEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña con fotos de cada una de las superficies a construir, como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la información en el lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada
RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2022

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ENE-MAR/2022
FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0%

PRIOIDAD **2** Nombre de la obra: **CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

GRUPO DE LOCALIZACIÓN

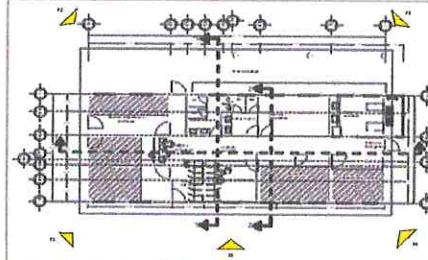

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7, Paraje Titlacuatlla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: SUPERFICIE A CONSTRUIR



F2: SUPERFICIE A CONSTRUIR

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: SUPERFICIE A CONSTRUIR



F4: SUPERFICIE A CONSTRUIR



DR. MODESTO CSARA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

PROF. MELANY COLEVAS MANUEL
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexan fotos y videos en formato digital y en físico. Se recomienda que se capturen fotos y videos en el lugar para antes, durante y después de la obra. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capturen fotos y videos en el lugar para antes, durante y después de la obra.
