

Oficio No.: VRAD/E/122/2018.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 14 de junio de 2018.

DOCTOR
SALVADOR ALEJANDRO MALO ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DGESU
P R E S E N T E:


Por este conducto y en atención al oficio número: 511-3/2018.-0511 de fecha 23 de mayo de 2018 y en alcance al similar número: 511/2015.-0373, envío el informe de los avances de las obras apoyada a través del Recurso FAM 2018 (anexo CD con información magnética).

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx, centrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

"praeteritum noscere, posterum melior"


L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ PONCE
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ.- Director de Fortalecimiento Institucional.- Para su conocimiento.
Expediente.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
mayo_2018
FECHA DE CORTE: 31/05/18

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de la Cañada**
Entidad federativa: Oaxaca
Clave Inst 911: ZOMSU0032V

RESPONSABLES

Planación	Obras y Mantenimiento
Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Teléfono: (296) 372 07 15, Ext.: 200 Correo electrónico: vicr_admin@unca.edu.mx	Nombre: ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Teléfono: (296) 372 07 15, Ext.: 208 Correo electrónico: melany90@trnmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO


OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Adquisición y mejoras	Mantenimiento	Proyectos institucionales				Espacio/equipa	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Cuenta con Actas		
																						Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada	X					\$ 3,119,262.00	\$ -	\$ 3,119,262.00						0			El proyecto se encuentra en trámite administrativo.						
TOTAL											0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO											
2	Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada		X				\$ 950,650.00	\$ -	\$ 950,650.00						0			El proyecto se encuentra en trámite administrativo.						
TOTAL											0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO											
3	Ampliación de la Biblioteca de la Universidad de la Cañada.		X				\$ 1,620,262.96	\$ -	\$ 1,620,262.96						0			Para éste se solicitó un cambio de proyecto, debido a que el recurso asignado es insuficiente para concluir la meta.						
TOTAL											0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO											
8	Reemplazo de Boilers de gas por Calentadores solares e implementación de Wathorímetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada.			X			\$ 187,532.00	\$ -	\$ 187,532.00						0			El proyecto se encuentra en trámite administrativo.						
TOTAL											0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO											
							\$5,877,727.76	\$0.00	\$5,877,727.76															

DR. MODESTO BERRIOZABUEN
Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
mayo_2018

FECHA DE CORTE: 31/05/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PROYECTO: 1 Nombre de la obra: **Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada**



Porcentaje de avance

0


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

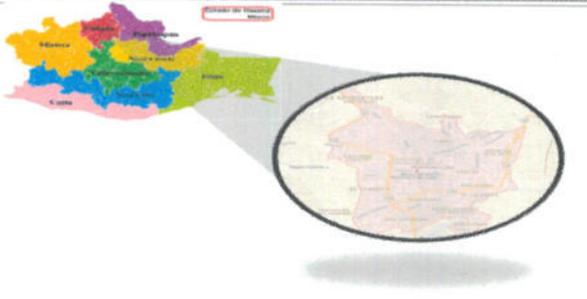

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS




F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Fachada posterior




F4: Entram



F5: Interior de aula

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

ARO. MELANY CUEVAS MANUEL
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se copia y se pega en las pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
mayo_2018
FECHA DE FONTE 31.05.2018

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIOIDAD **2** Nombre de la obra: **Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

0

FOTOS



P1: Fachada principal



P2: Interior


Comentarios de los trabajos realizados:



P3: Fachada posterior



P4: Situada



P5: Interior de sala

C.R. MODESTO SEARA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se recomienda que antes y después de la obra, se capturen fotos de la obra. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma (misma angulo e tipo) para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada
RECTORÍA



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
mayo_2018
FECHA DE CORTE

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

0

PRIMARÍA 3 Nombre de la obra: **Ampliación de la Biblioteca de la Universidad de la Cañada.**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS




F1: Fachada principal



F2: Interior

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

[Handwritten signature]
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se envía una pestaña, se pueden hacer tantas pestañas como obras se realizaron. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y luz, para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
