

Oficio No.: VRAD/E/005/2019.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 09 de enero de 2019.

**DOCTORA**  
**CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA**  
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA "DGESU"  
P R E S E N T E:

Por este conducto y en atención al oficio número 511-3/2018.-0511 de fecha 23 de mayo de 2018 y en alcance al similar número 511/2015.-0373 envió el informe de los avances con fecha corte 31 de enero de 2018, de las obras apoyadas a través del Recurso FAM 2018. (anexo CD con información magnética)

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos [rocioc@nube.sep.gob.mx](mailto:rocioc@nube.sep.gob.mx), [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx) y [jcarlosv@nube.sep.gob.mx](mailto:jcarlosv@nube.sep.gob.mx)

Sin otro particular, le reitero mi más distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**  
*"praeteritum noscere, posterum molior"*

L.C.E. ALEJONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.  
ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL.- Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.- Para su conocimiento y seguimiento.  
Archivo.

2018



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**diciembre\_2018**  
FECHA DE CORTE 31/12/2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de la Cañada**  
Entidad federativa: **Oaxaca**  
Clave Inst 011-20MSU0032V

Planescon  
Nombre: **L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ**  
Cargo: **VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN**  
Teléfono: **(238) 372 07 15, Ext. 200**  
Correo electrónico: **vice\_admin@unca.edu.mx**

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento  
Nombre: **ARG. MELANY CUEVAS MANUEL**  
Cargo: **JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
Teléfono: **(238) 372 07 15, Ext. 208**  
Correo electrónico: **melanyf0@hotmail.com**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que se realizaron al avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada							
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Adquisición y/o mejoras	Mantenimiento				Proyecto autorizados	Espacios/equipos	cantidad				metros cuadrados	¿Cuenta con fotos del evento?			¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa				
1	Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada	X				\$ 3,119,262.00	\$ 1,513,026.06	\$ 1,606,235.94				Adquisición de equipos de cómputo	Suministro de muebles de Laboratorio	48%	05/12/18	17/02/18	Se tiene comprometido el recurso y se realizó la entrega del anticipo. Los equipos de laboratorio se encuentran en proceso de fabricación y únicamente se recibió el mobiliario de oficina.									
TOTAL									0	0.00																
2	Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada		X			\$ 950,650.00	\$ 950,650.00	\$ -				Se realizaron los trabajos de pintura, de impermeabilización de Dóctrica y auditorio, se adaptaron las puertas y está en proceso de colocarlo y se colocó y cobocó al don de biblioteca	Colocación de Puertas tipo Capto	99%	05/11/18	31/12/18	Se concluyeron los trabajos de pintura, impermeabilización, se cobocó el don y se adaptaron las puertas tipo Capto mismas que están en proceso de colocación									
TOTAL									18	7,589.04																
3	Construcción de una Cancha de Usos Múltiples, en la Universidad de la Cañada.			X		\$ 1,620,262.98	\$ 1,620,262.98	\$ -				Cancha de Usos Múltiples		99%	23/10/18	31/12/18	Se tiene comprometido el recurso la obra está en proceso de ejecución.									
TOTAL									1	710.00																
8	Reemplazo de Boilers de gas por Calentadores solares e implementación de Watermetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada.				X	\$ 187,532.00	\$ 187,532.00	\$ -				Calentadores Solares	13	0.00			Se realizó la adquisición de los watermetros debido a un retraso en el suministro	La instalación de los watermetros	99%	26/11/18	30/12/18	Se concluyó con los trabajos de instalación de calentadores solares y actualmente se encuentran en uso, debido a condiciones antes de la institución, hubo un retraso en la entrega de los watermetros, la fecha indicada para la realización de la misma es del 11-ene-18.				
TOTAL									14	0.00																
TOTAL									27	0.00																
						\$1,977,727.78	\$4,071,611.02	\$1,606,235.94																		

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

ARG. MELANY CUEVAS MANUEL  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturará los espacios que se autorizan a la obra. Se podrán anovar tantas filas como sea necesario.  
2 En esta sección se reportará la forma física construida, para a realizar, mismos que se serán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que los datos de avance y presupuesto autorizados, estén en dos dígitos: 00, 00 y 00

2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**diciembre\_2018**  
FECHA DE CORTE: 31/12/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

48

PRIMARIA 1 Nombre de la obra: **Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada**

GRUPOS DE LOCALIZACIÓN

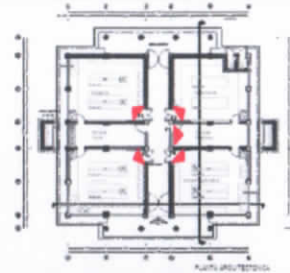

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlán- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7, Paraje Titlacuattla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Vista Interior Inorgánica



F2: Vista Interior Instrumental

Comentarios de los trabajos realizados:  
  
A la fecha se tiene suministrado únicamente el mobiliario de oficina (F5), el mobiliario y equipo de laboratorio está en proceso de fabricación.  
  
El material de oficina está resguardado en Área de Orgánica en el Edificio de Laboratorio de Investigación, para que una vez que se tenga el mobiliario y equipo de laboratorio se distribuya en las diferentes áreas.



F3: Vista Interior Almacén de Reactivos




F4: Vista Interior Bromatología/Micro



F5: Vista Interior Organica (resguardo de material de oficina)

  
DR. MODESTO SERNA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
El equipamiento suministrado y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**diciembre\_2018**  
PRIMA DE CUENTA

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

99

Proyecto: **2** Nombre de la obra: **Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada**

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Tecitlán- San Antonio Naranhatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuililla, Tecitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Fachada principal Biblioteca (edificación pintada e impermeabilizada)



F2: Área Superior de Biblioteca. Torres instaladas

Comentarios de los trabajos realizados:

Los trabajos realizados fueron:  
"Impermeabilización de techos"  
"Revestimiento de la impermeabilización de Auditorio"  
"Mantenimiento de de pintura en los edificios de módulos de aulas del 1-4, módulos de aulas del 5-11, Facultad, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Administración, Biblioteca, Casa del Rector, Departamento de Profesores, Cálculos, Instituto de Farmacología, Sala de Computo 1, Sala de Auto acceso, Centro de Alumnos, Laboratorio de Biología, Laboratorio de Química, Laboratorio de Farmacología y Auditorio."  
"Fabricación y colocación de estacapas de Cierre de acera y pulido en la superficie de biblioteca."



F3: Fachada Auditorio (impermeabilizada y pintura)



F4: Puertas CAPCE del edificio de Auditorio (por cambios)



F5: Fachada edificio Oficina de Obras y Mantenimiento de la ES

DR. MORESTO SEARA VARGAS  
Nombre y firma del Titular de la ES

*[Handwritten signature]*  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la ES



Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**diciembre\_2018**  
FECHA DE CORTE: 31/12/2018


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance  
**99**

PROYECTO: **3** Nombre de la obra: **Construcción de una Cancha de Usos Múltiples, en la Universidad de la Cañada.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7, Paraje Titlacualtilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: concreto armado en columnas



F2: piso de concreto f'c=200 kg/cm2

Comentarios de los trabajos realizados:

Con fecha 23 de octubre de 2018 se dio inicio a los trabajos de la construcción de la cancha de usos múltiples, se realizó el despalme, limpieza base y nivelación, se inició la excavación y se suministraron materiales como acero de refuerzo y labores.

Se habilitó el acero para zapatas ancladas, columnas, zapatas corridas, contratables, cadenas y cimientos, se colocaron zapatas, contratables, dadas, cadenas y castillos y se erriccó el muro de 20 cm.



F3: estructura de acero para portera y tablero.



F4: retazo de acero del interior de la superficie de cancha.



F5: piso de concreto armado en portera.

UNCA  
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
Nombre y firma del Titular de la EES  
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la EES

\* Es muy importante que en cada reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mobiliario y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

UNCA  
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la EES

2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**diciembre\_2018**  
FOLIO DE CONTINIO: 01/12/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCES MENSUAL




Porcentaje de avance

99

Nombre de la obra: **Reemplazo de Boilers de gas por Calentadores solares e implementación de Wathorímetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatlipan Km. 1.7, Paraje Tilaouatlila, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

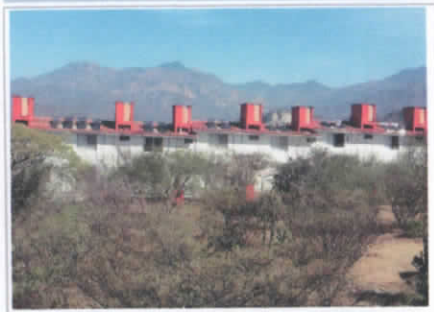

F1: Fachada posterior del Edificio (calentadores solares instalados)



F2: Fachada posterior bajo pendiente (calentador instalado)

**Comentarios de los trabajos realizados:**  
Se concluyó con los trabajos de instalación de calentadores solares y actualmente se encuentran en uso, debido a condiciones óptimas a la instalación, hubo un retraso en la entrega de los wathorímetros, la fecha estimada para la realización de la misma es del 11-abn-19.



F3: Área para instalación de Wathorímetros



F4: Fachada posterior (instalación de calentadores solares)



F5: Personal realizando puesta en marcha de un calentador

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Este y siguientes se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

