



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

*"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"*

Oficio No. VRAD/E/183/2019.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 09 de agosto de 2019.

**DOCTORA**  
**CARMEN ENEDINA RODRIGUEZ ARMENTA**  
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA DGESU  
P R E S E N T E:

Por este conducto y en atención al oficio 511/2019.-0275 de fecha 18 de febrero de 2019 envió el informe de avance del mes de julio, con fecha corte 31 de julio de año 2019, de las obras apoyada a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2019. (anexo CD con información magnética).

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

*"praeteritum noscere, posterum molior"*

L.C.E. ALEJANDRO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.  
DR. ISAÍAS ELIZARRAZ ALCARAZ.- Director de Fortalecimiento Institucional.- Para su conocimiento.  
Expediente.

2019

A330

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

julio\_2019

FECHA DE CORTE: 31/07/2019

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Cañada  
Entidad federativa: Oaxaca  
Clave Inst 911 20MSU002Y

RESPONSABLES

Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre:	L. C. E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ	Nombre:	ARIQ MELANY CUEVAS MANUEL
Cargo:	VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN	Cargo:	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Teléfono:	(239) 372 07 15, Ext. 200	Teléfono:	(239) 372 07 15, Ext. 208
Correo electrónico:	vice_admin@unca.edu.mx	Correo electrónico:	supervision.obras@unca.edu.mx, melany60@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO


OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada			Cuenta con Actas	
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisición y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Especial/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Entrega-Recepción (Acta final)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa	
																							¿Cuenta con fotos del evento?
1	Construcción de un edificio diez Aulas Pedagógicas en la Universidad de la Cañada	X				\$ 5,668,129.98	\$ -	\$ 5,668,129.98				Limpa trazo, excavación, planchales, habilitado y colocado de acero de refuerzo en cimentación	Continuar con los cascabelos de cimentación, posteriormente, estructuras, albañilería y acabados, etc	4%	15/07/19	11/11/19	En Proceso de Ejecución	SI	-	-	NO	NO	\$0.00
<b>TOTAL</b>									0	0.00													
2	Construcción de un Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación en la Universidad de la Cañada (C.I.N.A.)	X				\$ 5,042,429.96	\$ -	\$ 5,042,429.96						0%			En proceso Administrativo	NO, debido a que solo fueron trabajos de mantenimiento de edificios	-	-	NO	NO	\$0.00
<b>TOTAL</b>									0	0.00													
						<b>\$10,710,559.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,710,559.94</b>															

DR. MOCÉSTO SEARA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

ARIQ MELANY CUEVAS MANUEL  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra de proyecto. Se podrán anexas tantas filas como sea necesario.  
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.



Universidad de la Cañada  
RECTORÍA



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**julio\_2019**

FECHA DE CORTE: 31/07/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1**

Nombre de la obra: **Construcción de un edificio diez Aulas Pedagógicas en la Universidad de la Cañada**





Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

**4**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

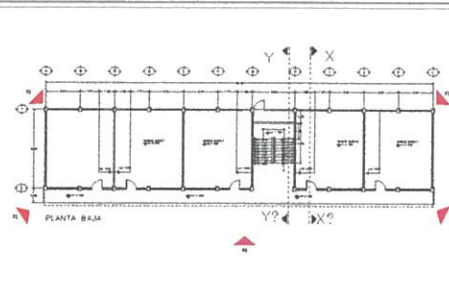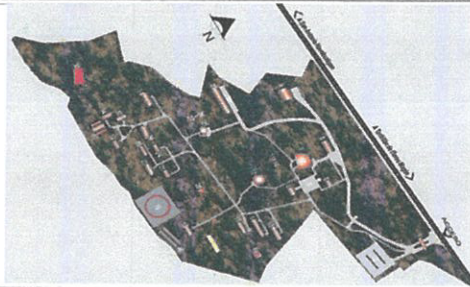

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7, Paraje Titlacuattila, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

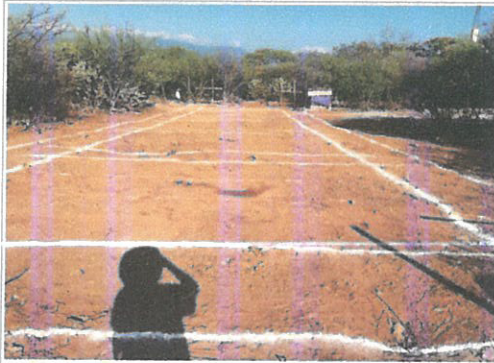


F1: Limpieza y trazo




F2: Excavación en terreno tipo B o C

Comentarios de los trabajos realizados:


En proceso de ejecución.

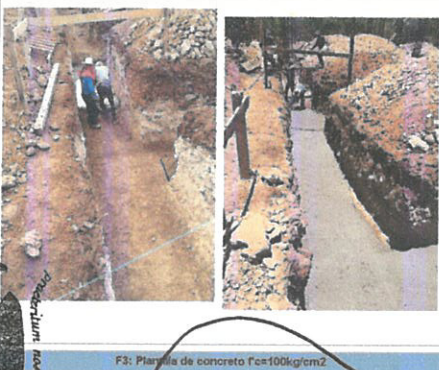

F3: Plancha de concreto f'c=100kg/cm2

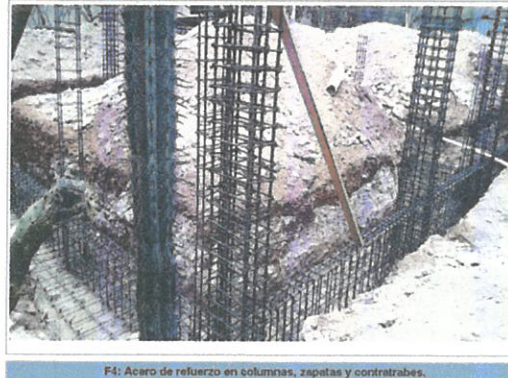

F4: Acero de refuerzo en columnas, zapatas y contratabres.

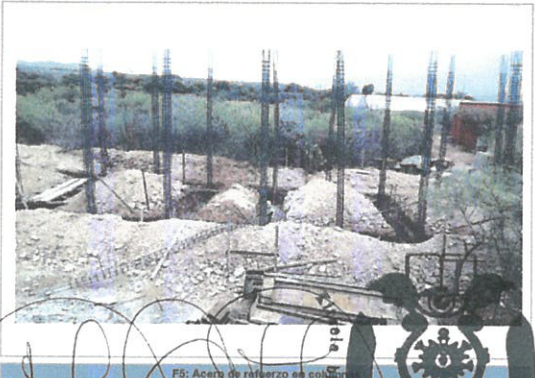

F5: Acero de refuerzo en columnas y vigas

DR. MODESTO CERRA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ARG. MELANY CUEVAS MARQUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Es importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capturen en la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**julio\_2019**

FECHA DE CORTE 31/07/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0

ACTIVIDADES 2

Nombre de la obra: **Construcción de un Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación en la Universidad de la Cañada (C.I.N.A.)**

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatlapan Km. 1.7, Paraje Titlacuutila, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: vista del sitio antes de la Edificación.



F2: vista del sitio antes de la Edificación.



F3: vista del sitio antes de la Edificación.



F4: vista del sitio antes de la Edificación.

Comentarios de los trabajos realizados:  
  
En proceso Administrativo



F5: Fachada Construcción (pendiente)

DR. ROBERTO SEARA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES


[Signature]  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Se reportará que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestiña, se podrán copiar tantas pestiñas como sea necesario.  
El mantenimiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
