

Oficio No.: VRAD/E/040/2019.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 01 de marzo de 2019.

**DOCTORA**  
**CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA**  
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA "DGESU"  
P R E S E N T E:

Por este conducto y en atención al oficio número: 511-3/2018.-0511 de fecha 23 de mayo de 2018 y en alcance al similar número: 511/2015.-0373 envió el informe de los avances correspondientes al mes de enero y febrero de 2019, así como las actas administrativas de entrega-recepción de las obras apoyadas a través del Recurso FAM 2018 (anexo CD con información magnética).

Dicha información se envía de manera electrónica a los correos [rocioc@nube.sep.gob.mx](mailto:rocioc@nube.sep.gob.mx), [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx) y [jcarlosv@nube.sep.gob.mx](mailto:jcarlosv@nube.sep.gob.mx)

Sin otro particular, le reitero mi más distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

*"praeteritum noscere, posterum molior"*

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.  
ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL.- Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.- Para su conocimiento y seguimiento.  
Archivo.

2018

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**febrero 2019**  
FECHA DE CORTE: 29/02/2019

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



NOMBRE Universidad de la Cañada

Entidad federativa: Oaxaca

Código Inst 911 20MSJ0032V

Planeación

NOMBRE L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
Cargo VICE-RECTOR DE ADMNISTRACIÓN  
Teléfono (236) 372 07 15, Ext. 200  
Correo electrónico vica\_admin@unca.edu.mx

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento  
Nombre ARG. MELANY CUEVAS MANUEL  
Cargo JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
Teléfono (236) 372 07 15, Ext. 208  
Correo electrónico mlaney60@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada					
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Especial/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta final)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada	X				\$ 3,119,262.00	\$ 3,119,262.00	\$ -	Laboratorio de investigación	1	0.00	Suministro e instalación de muebles de Laboratorio	Otra terminada	100%	05/12/18	17/02/19	Se concluyeron los trabajos	SI	-	-	SI	SI	\$3,119,262.00	
		<b>TOTAL</b>									1	0.00												
2	Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada		X			\$ 950,650.80	\$ 950,650.80	\$ -	Edificios de la Universidad de la Cañada atendidos	18	7,599.04	Se realizaron los trabajos de pintura, de impermeabilización de biblioteca y auditorio, se adquirieron y colocaron las puertas tipo CAFFICE y se adquirió, colgó el domo de biblioteca	Otra terminada	100%	05/11/18	18/01/19	Se concluyeron los trabajos	NO, debido a que solo fueron trabajos de mantenimiento de edificios	-	-	SI	SI	\$950,650.80	
		<b>TOTAL</b>									18	7599.04												
3	Construcción de una Cancha de Usos Múltiples, en la Universidad de la Cañada.		X			\$ 1,620,282.96	\$ 1,620,282.96	\$ -	Cancha de Usos Múltiples	1	710.00	EXCAVACIÓN A MANO HELADO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE SUELO, TRABAJOS DE LISA Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO. SE REALIZÓ CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MANTENIMIENTO DE 28.50 M DE ALTURA, 1.20 M DE ANCHURA, 1.20 M DE ESPESOR Y 200 AUGUAS BRILLANTES DE 3 LITROS, BRILAS PARA PINTURA DE VOLADILLO, PANTALLA CLIMATIZADA	Otra terminada	100%	23/10/18	31/01/19	Se concluyeron los trabajos	NO, debido a que únicamente se trata de la primera etapa	-	-	SI	SI	\$1,620,282.96	
		<b>TOTAL</b>									1	710.00												
8	Reemplazo de Boilers de gas por Calentadores solares e implementación de Wathorímetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada.		X			\$ 197,532.00	\$ 197,532.00	\$ -	Calentadores wathorímetros	13	0.00	Se realizó la adquisición de los materiales y los equipos. Se instalaron los calentadores y los wathorímetros	Otra terminada	100%	26/11/18	18/01/19	Se concluyeron los trabajos	NO, debido a que únicamente se trata de adquisiciones, a un edificio existente	-	-	SI	SI	\$197,532.00	
		<b>TOTAL</b>									27	0.00												
						\$6,877,727.76	\$6,877,727.76	\$0.00																

ER MOÉSITO SEARA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

ARG. MELANY CUEVAS MANUEL  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, dd, mm y aa.



2018

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL / DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**febrero\_2019**  
FECHA DE CORTE: 28/2/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

48

PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: **Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada**

GRUPOS DE LOCALIZACIÓN

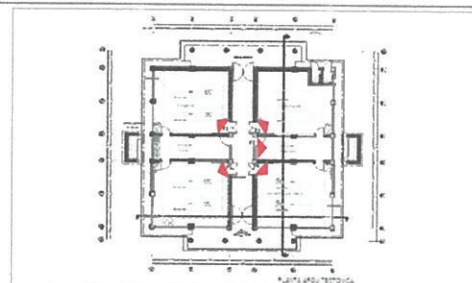

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Hanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuattla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Vista Interior Inorgánica (Equipado)




F2: Vista Interior Instrumental (Equipado)

Comentarios de los trabajos realizados:  
EQUIPAMIENTO CONCLUIDO AL 100%



F3: Vista Interior Almacén de Reactivos (Equipado)

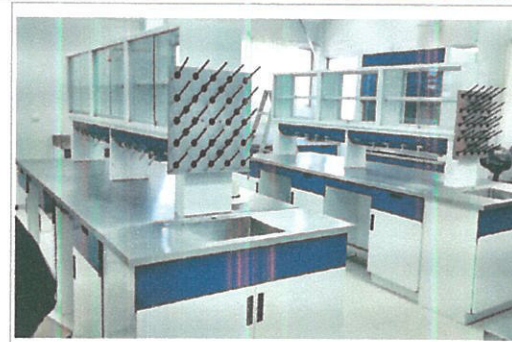

F4: Vista Interior Bromatología/Micro (Equipado)



F5: Vista Interior Orgánica (Equipado)

DR. ANGELO BLANCO VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**febrero\_2019**

FECHA DE CORTE: 28/02/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

99

PRIMORDIAL 2

Nombre de la obra: **Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

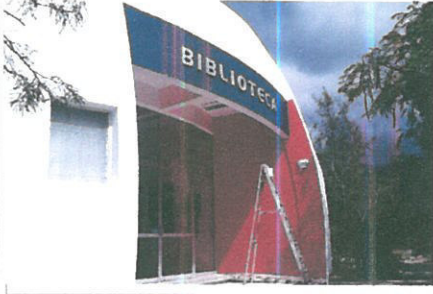

F1: Fachada principal Biblioteca (edificio pintado e impermeabilizado)



F2: Área Superior de Biblioteca. Domo instalado

Comentarios de los trabajos realizados:

Los trabajos realizados fueron:  
\*Impermeabilización de biblioteca  
\*Mantenimiento de la impermeabilización de Ascitorio  
\*Mantenimiento de la pintura en los edificios de: módulos de aulas del 1-4, módulo de aulas del 5-6, módulos de aulas del 7-11, Recibida, Vice-Rectoría Académica, Vice-Rectoría de Administración, Biblioteca, Casa del Rector, Departamento de Profesores, Cafetería, Instituto de Farmacobiología, Sala de Computo 1, Sala de Auto acceso, Centro de Idiomas, Laboratorio de Biología, Laboratorio de Química, Laboratorio de Farmacología y Auditorio  
\*Fabricación y colocación de estructura de Domo de acero y policarbonato en la superficie de biblioteca  
\*Colocación de 14 Puertas tipo Capfice



F3: Fachada Auditorio (impermeabilizado y pintado)



F4: Puertas CAPFICE del edificio de Aulas (HUEVAS)



F5: Fachada Centro de laboratorios (pintado)

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reportes fotográficos de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

febrero\_2019

FECHA DE CORTE 18/1/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

99

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: Construcción de una Cancha de Usos Múltiples, en la Universidad de la Cañada.

CROQUIS DE LOCALIZACION



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Naranhuatipan Km. 1.7; Paraje Tiltacuabilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Cancha de Usos Múltiples Concluida



F2: Cancha de Usos Múltiples Concluida



F3: Cancha de Usos Múltiples Concluida



F4: Cancha de Usos Múltiples Concluida



F5: Cancha de Usos Múltiples Concluida

Comentarios de los trabajos realizados:

Cancha de Usos Múltiples Concluida

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**febrero\_2019**  
FECHA DE CORTE: 28/02/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

Porcentaje de avance

99

Nombre de la obra: **Reemplazo de Boilers de gas por Calentadores solares e implementacion de Wathorímetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada**


CHORRIS DE LOCALIZACION




UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatlapan Km. 1.7; Paraje Tiltlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

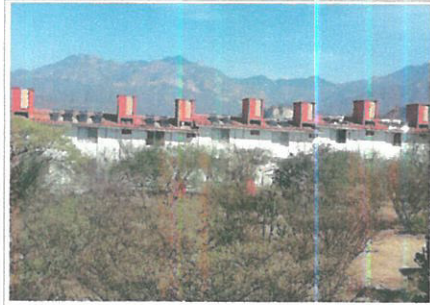


F1: Fachada posterior del edificio (calentadores solares instalados)

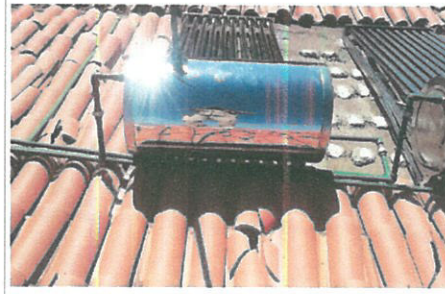

F2: Fachada posterior lado poniente (calentador instalado)

Comentarios de los trabajos realizados:

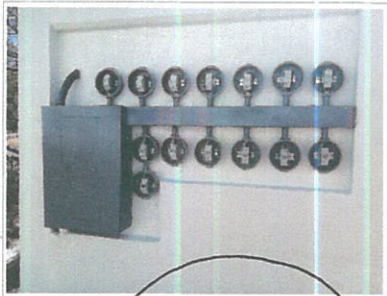

F3: Wathorímetros (instalados)



F4: Fachada posterior (instalacion de calentadores solares)



F5: Perspectiva fachada posterior (carga de agua caliente)

DR. MOCOSTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la ES

DR. BELMONTES MORALES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la ES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa esta pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
