



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

*"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"*

Oficio No. VRAD/E/210/2019.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 05 de septiembre de 2019.

**DOCTORA**  
**CARMEN ENEDINA RODRIGUEZ ARMENTA**  
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA DGESU  
P R E S E N T E:

En atención al oficio 511/2019.-0275 de fecha 18 de febrero de 2019; por este conducto me permito enviarle el informe de avance correspondiente al mes de agosto, con fecha corte 31 de agosto de 2019, de las obras apoyadas a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 201 (anexo CD con información magnética).

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**  
*"praeteritum noscere, posterum molior"*

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.  
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ.- Director de Fortalecimiento Institucional.- Para su conocimiento.  
Expediente.

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**agosto\_2019**  
 FECHA DE CORTE: 31/08/2019

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de la Cañada**  
 Entidad federativa: **Oaxaca**  
 Clave Inst 911: **206SLKZ2V**

RESPONSABLES

Paración  
 Nombre: **L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ**  
 Cargo: **VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN**  
 Teléfono: **(236) 372 07 15. Ext. 200**  
 Correo electrónico: **vice\_admin@unca.edu.mx**

Obras y Mantenimiento  
 Nombre: **ARQ. MELANY CLEVAS MANUEL**  
 Cargo: **JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
 Teléfono: **(236) 372 07 15. Ext. 208**  
 Correo electrónico: **supervision-obras@unca.edu.mx, melany00@hotmail.com**

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

**OBRA CONCLUIDA**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fechas		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de construcción	Equipamiento	Asesoramiento y apoyo	Mantenimiento				Proyectos de infraestructura	Español	m²				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta físico)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Construcción de un edificio diez Aulas Pedagógicas en la Universidad de la Cañada	X				\$ 5,668,129.96	\$ -	\$ 5,668,129.96				Acero de refuerzo en construcción, columnas, muros, cobado de cimentación, murete de enrase y labilidad de esdema de concreto de carpente.	Continuar el cobado de cadena de carpente, relleno de material inerte, muros de 14 y 20 cm, cadenas castillos, columnas, muros de concreto armado, etc.	10%	15/07/19	11/11/19	En Proceso de Ejecución.	NO	-	-	NO	NO	\$0.00	
GLOBAL DEL PROYECTO																								
2	Construcción de un Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación en la Universidad de la Cañada (C.I.N.A.)	X				\$ 5,042,429.96	\$ -	\$ 5,042,429.96						0%			Se realizó el proceso de licitación, mismo que tiene periodo de ejecución del 03-sep-2019 al 31-dic-2019	NO	-	-	NO	NO	\$0.00	
GLOBAL DEL PROYECTO																								
						<b>\$10,710,559.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,710,559.92</b>																


DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. MELANY CLEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

- 1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.
- 2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
- 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en día domingo, mes y año.



Universidad de la Cañada  
 RECTORÍA



Universidad de la Cañada  
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**agosto\_2019**  
FECHA DE CORTE: 31/08/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

**10**

Prioridad **1**

Nombre de la obra: **Construcción de un edificio diez Aulas Pedagógicas en la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

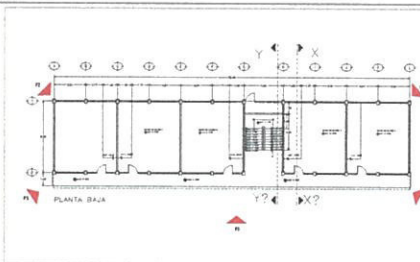

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Tootitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7, Paraje Tifacualifa, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Habilitado y cobrado de acero de refuerzo y cimbrado de cimentación.




F2: Colado de la cimentación.

Comentarios de los trabajos realizados:


En proceso de ejecución.



F3: Muro de enrase de 20 cm

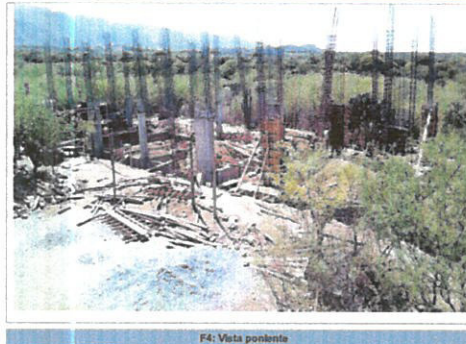

F4: Vista general

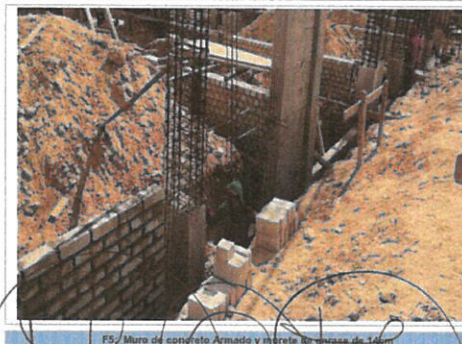

F5: Muro de concreto Armado y murete en enrase de ladrillo

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES


DR. MELAY CUEVA MATEO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una portafolio, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**agosto\_2019**

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 Universidad de la Cañada	<b>PROYECTO 2</b> Nombre de la obra: <b>Construcción de un Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación en la Universidad de la Cañada (C.I.N.A.)</b>	<b>UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO</b>
Porcentaje de avance <b>0</b>	<b>CROQUIS DE LOCALIZACION</b> 	<b>PLANTA ARQUITECTONICA BAJA</b> 

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatlipan Km. 1.7: Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

**FOTOS**



F1: vista del sitio antes de la Edificación.

F2: vista del sitio antes de la Edificación.

**Comentarios de los trabajos realizados:**

Se realizó el proceso de licitación, mismo que tuvo periodo de ejecución del 03-ago-2019 al 31-dic-2019



F3: vista del sitio antes de la Edificación.

F4: vista del sitio antes de la Edificación.



F5: Fachada Centro de Investigación


DR. MOJIBTO BEARA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

*[Handwritten Signature]*  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se pedrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada  
RECTORÍA



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
