



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

“2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

Área:	Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.:	VRAD/E/311/2019.
Asunto:	Informe mensual del FAM 2019.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 10 de diciembre de 2019.

DOCTORA
CARMEN ENEDINA RODRIGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA “DGESU”
P R E S E N T E:

En atención al oficio 511/2019.-0275 de fecha 18 de febrero de 2019; por este conducto me permito enviarle el informe de avance correspondiente al mes de noviembre, con fecha corte 30 de noviembre de 2019, de las obras apoyadas a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2019 (anexo CD con información magnética).

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx, centrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
“praeteritum noscere, posterum molior”


L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ.- Director de Fortalecimiento Institucional.- Para su conocimiento.
Expediente.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
noviembre_2019

FECHA DE CORTE 30/11/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de la Cañada**
Entidad federativa: **Oaxaca**
Clave Inst 911: **20MSU0032V**

Nombre: **L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ**
Cargo: **VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN**
Teléfono: **(238) 372 07 15, Ext.: 200**
Correo electrónico: **vica_admin@unca.edu.mx**

RESPONSABLES

Planación

Obras y Mantenimientos

Nombre: **ARG. MELANY CUEVAS MANUEL**
Cargo: **JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**
Teléfono: **(238) 372 07 15, Ext.: 208**
Correo electrónico: **supervision-obras@unca.edu.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Obras de construcción	Equipoamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción
1	Construcción de un edificio diez Aulas Pedagógicas en la Universidad de la Cañada	X				\$ 5,066,129.06	\$ 3,652,573.03	\$ 2,015,556.95	Diez Aulas Pedagógicas	1.00	646.10	Se realizó colado de losa de azóles, se inició aplastado, muros de 14 cm, cadenas y castillos, instalación eléctrica, relleno con material inerte, separación muro-columna, etc.	continuar con los aplastados, chafado de cielo raso, muros de 14 cm en planta alta, separación muro columna en planta alta, colado de baldes eléctricos, etc.	86%	15/07/19	11/11/19	En Proceso de Ejecución.	NO	-	-	NO	NO	\$0.00
									TOTAL	1	646.10												
									GLOBAL DEL PROYECTO														
2	Construcción de un Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación en la Universidad de la Cañada (C.I.N.A.)	X				\$ 5,042,429.06	\$ 87,797.37	\$ 4,954,632.59	C.I.N.A.	1	547.42	se realizó el cimbrado y colado de la cimentación, muros de enrase, cadenas y castillos, cadenas de desplante, relleno y muros de tabique de 14 cm, etc.	continuar con Muros de tabique de 14, colado de columnas, colado de muros, relleno de material inerte, etc.	11%	03/09/19	31/12/19	En Proceso de Ejecución.	NO	-	-	NO	NO	\$0.00
									TOTAL	1	547.42												
									GLOBAL DEL PROYECTO														
						\$16,710,559.84	\$3,740,370.40	\$8,970,189.54															

DR. MOisés DEAR VÁZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

ARG. MELANY CUEVAS MANUEL
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimientos

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán agregar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: día, mes y año.

Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
noviembre 2019

FECHA DE CORTE: 30/11/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

86

PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: **Construcción de un edificio diez Aulas Pedagógicas en la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

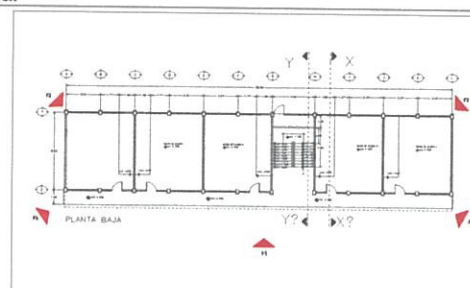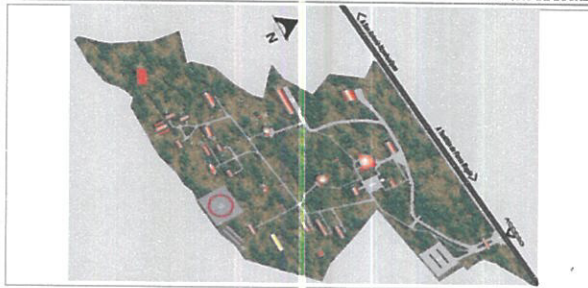

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatpan Km. 1.7; Paraje Titacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Colado de losa de azotea, aplonado de muros de 14 cm.



F2: Descibrado de traveses y volado de losa de azotea.

Comentarios de los trabajos realizados:

En proceso de ejecución.



F3: Descibrado de traveses y volado de losa de azotea, muro de tabique de 14 cm.



F4: Descibrado de losa de azotea, muro de tabique de 14 cm.



F5: Relleno, aplonado y estuco en juntas altas y bajas.

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

Universidad de la Cañada

ADMINISTRACIÓN

ARO-MELANY CUEVA MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, tiempo, ángulo y tipo de cámara para la antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
noviembre_2019
FECHA DE CORTE: 30/11/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

11

PRIOIDAD **2** Nombre de la obra: **Construcción de un Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación en la Universidad de la Cañada (C.I.N.A.)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatpan Km. 1.7; Paraje Ttilacuautla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: colado de cimentación, colado de columnas en P.Baja y muros de 14 cm.



F2: Colado de columnas en P.Baja y muros de tabique de 14 cm.

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra en proceso de ejecución.



F3: acero de refuerzo en estructuras y cimbrado de columnas en P. baja



F4: acero de refuerzo en estructuras.



F5: acero de refuerzo en estructuras.

DILADORETTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

MICHELLE CARRASCO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla de registro con el formato como se muestra. Para el equipo de mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma foto, en el mismo lugar y hora, para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
