



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

“2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

Oficio No. VRAD/E/153/2019.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 08 de julio de 2019.

DOCTORA
CARMEN ENEDINA RODRIGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DGESU
P R E S E N T E:

Por este conducto y en atención al oficio 511/2019.-0275 de fecha 18 de febrero de 2019 envió el informe de avance del mes de junio, con fecha corte 30 de junio de año 2019, de las obras apoyada a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2019. (anexo CD con información magnética).

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE

“praeteritum noscere, posterum molior”

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ.- Director de Fortalecimiento Institucional.- Para su conocimiento.
Expediente.

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
junio 2019
FECHA DE CORTE 30/6/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Nombre: **Universidad de la Cañada**
Entidad federativa: Oaxaca
Clave Inst 911: 20MSU0032V

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

RESPONSABLES

Platación
Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Teléfono: (236) 372 07 15. Ext: 200
Correo electrónico: vice_admin@unca.edu.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL
Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Teléfono: (236) 372 07 15. Ext: 208
Correo electrónico: supervision-obras@unca.edu.mx, melany6@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Obras de construcción	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustantivo				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Cuenta con Actas		
																						Entrega- Recepción (Acta Inauguro)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Construcción de un edificio diez Aulas Pedagógicas en la Universidad de la Cañada	X					\$ 5,668,129.98	\$ -	\$ 5,668,129.98						0%			En proceso de Licitación.	SI	-	-	NO	NO	\$0.00
TOTAL										0	0.00													
2	Construcción de un Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación en la Universidad de la Cañada (C.I.N.A.)	X					\$ 5,042,429.96	\$ -	\$ 5,042,429.96						0%			En proceso Administrativo.	NO debido a que solo fueron trabajos de mantenimiento de edificios.	-	-	NO	NO	\$0.00
TOTAL										0	0.00													
							\$10,710,559.94	\$0.00	\$10,710,559.94															

DR. MODESTO SEBASTIÁN VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Universidad de la Cañada
RECTORÍA



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


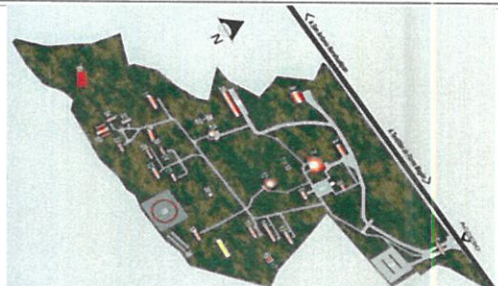

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

junio_2019

FECHA DE CORTE: 30/6/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 Universidad de la Cañada Porcentaje de avance <h1>0</h1>	PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: Construcción de un edificio diez Aulas Pedagógicas en la Universidad de la Cañada	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tildacuatlilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.
			

FOTOS



F1: Vista Interior Inorganica (Equipado)



F2: Vista Interior Instrumental (Equipado)


Comentarios de los trabajos realizados:
 En proceso de licitación.



F3: Vista Interior Almacén de Reactivos (Equipado)



F4: Vista Interior Bromatología/Micro (Equipado)

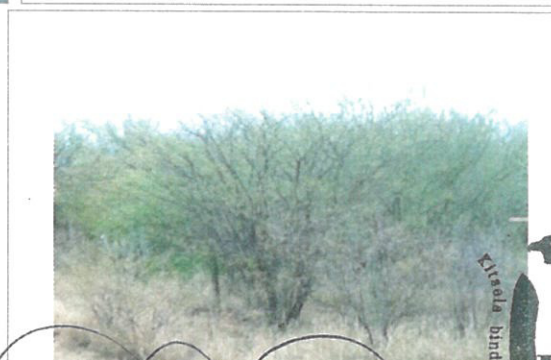

F5: Vista Interior Organica (Equipado)



DR. AUGUSTO SEARA VAZQUEZ
 Nombre y firma del Titular de la IES

AGNELMELINQUEAS MACEZ
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Es importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 El equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
junio_2019

FECHA DE CORTE: 30/6/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Construcción de un Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación en la Universidad de la Cañada (C.I.N.A.)

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

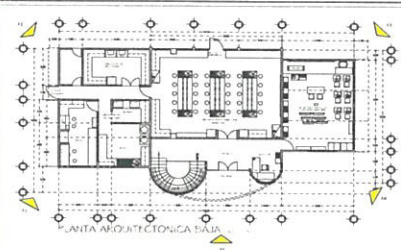

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tilaquatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0

FOTOS



F1: vista del sitio antes de la Edificación.



F2: vista del sitio antes de la Edificación.



F3: Fachada Centro de Idiomas (planiado)



F4: vista del sitio antes de la Edificación.



F5: vista del sitio antes de la Edificación.



F6: Fachada Centro de Idiomas (planiado)

Comentarios de los trabajos realizados:

En proceso Administrativo.

DR. MODESTO DEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

MELANY CUEVAS MARQUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
