



# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

## VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Área:	Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.:	UNCA/VRAD/E-111/2023.
Asunto:	Informe trimestral del FAM 2022.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 10 de abril de 2023.

**Doctora**

**Carmen Enedina Rodríguez Armenta**

Directora General de Educación Superior

Universitaria e Intercultural "DGESUP"

Secretaría de Educación Pública

Presente:

**Con At'n a: Dr. Eduardo Gerardo Rosas González**

Director de Fortalecimiento Institucional

En seguimiento al oficio número: 511/2022-0826-37 signado con fecha 18 de febrero de 2022 y por instrucciones de la Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Universidad de la Cañada; por este conducto me permito remitirle el informe de avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2022, correspondiente al trimestre enero-marzo, con fecha de corte 31 de marzo de 2023, debidamente requisitado y digitalizado en formato PDF con su respectivo archivo en Excel.

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formatos Excel y PDF, a los correos: [rocio@nube.sep.gob.mx](mailto:rocio@nube.sep.gob.mx) y [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx)

Así mismo, se hace llegar las actas de finiquito y actas de entrega-recepción en los formatos correspondientes, de las obras no. 1 y 2.


Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

*"praeteritum noscere, posterum molior"*

**L.C.E. Alfonso Martínez López**

Vice-Rector de Administración Universidad de la Cañada



VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

Con copia para:

Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias.- Rectora de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.

Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento.

M.A. Magaly Nictexa Fierro Muñoz.- Representante Institucional UNCA.- Mismo fin.

I.E. Armando Marín Nieto.- Encargado del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.

Archivo.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Cañada

Entidad federativa: Coahuila

Ciudad: Saltillo, Coahuila

PERSONAL

Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ

Cargo: VICE RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Teléfono: (36) 372 07 15, Ext. 306

Correo electrónico: vica\_admin@unca.edu.mx

RESPONSABLES

Nombre: ING. ARMANDO MARÍN NETO

Cargo: ENL DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Teléfono: (36) 372 07 15, Ext. 208

Correo electrónico: supervision-obras@unca.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejecutado	Remanente	Ámbito del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que existieron en el ámbito <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Administración y servicios	Mantenimiento				Proyecto de infraestructura	Españolización	Cantidad				Metros cuadrados	Inicio			Termino	Entrega- Recepción (Acta Ingreso)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa	
																							¿Cuenta con todos los eventos?
1	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X					\$9,694,029.00	\$ 6,694,029.00	\$	Escuelas Investigadas de Distribución: 1, 80.30 Redes: 1, 82.30 Electrónica: 1, 83.40 Verificación de acceso y área de trabajo: 1, 74.00 Sanitarios: 1, 10.10 Comedor: 1, 14.30 Investigación de Oportunidad de edificios: 1, 80.20 Área Ux: 1, 88.00 Innovación Educativa: 1, 78.00 Vestibulo: 1, 78.00 <b>TOTAL: 10 676.00</b>	Muros de fábrica para sala, sala de aulas, aplanado final, chubasco de elementos estructurales de concreto, fijas, losa, salidas, ventanas		100%	20/07/22	24/03/23	OBRA CONCLUIDA, PRIMERA ETAPA	NO	-	-	SI	SI	\$9,694,029.00	
2	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X				\$2,801,185.00	\$ 2,801,185.00	\$	Herrajes, abanilla y perfiles: 1, 24.40 Bodega de Herramientas: 1, 28.20 Vestibulo: 1, 40.00 Área de Intendencia: 1, 18.00 Oficina DPCM: 1, 28.10 Instalaciones Oficina: 1, 18.70 Copierteria: 1, 21.00 Servicio de Comedor: 1, 11.10 Área de Trabajo: 1, 82.40 Lavabos: 1, 1.60 Sanitarios: 1, 21.00 <b>TOTAL: 11 322.00</b>	Aplanado final, chubasco de elementos estructurales de concreto, estructura de acero vigas per, largueros, contravientos y contravientos para techado		100%	24/08/22	19/02/23	OBRA CONCLUIDA, PRIMERA ETAPA	NO	-	-	SI	SI	\$2,801,185.00		
						\$9,495,214.00	\$9,495,214.00	\$0.00															

MTRA. MARÍA DE LOS ANGELES CALTA ARNAS  
Rectora



ING. ARMANDO MARÍN NETO  
ENL DEL DEPTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



1 En capturas las acciones que corresponden a la obra o proyecto. Se pueden anexar fotos (no como sea posible).  
 2 En esta sección se detallan de forma breve y concisa los trabajos a realizar, siempre que se considere oportuno en el reporte fotográfico.  
 3 En esta sección se detallan de forma breve y concisa los trabajos a realizar. Todas en el formato de excel y pdf.



2022

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Max reportes  
**ENE-MAR/2023**  
PÁGINA DE CORTE: 1 DE 1


REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL TIPO/FORMA DE AVANCE INMEDIATA



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance  
**100%**

1 Nombre de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

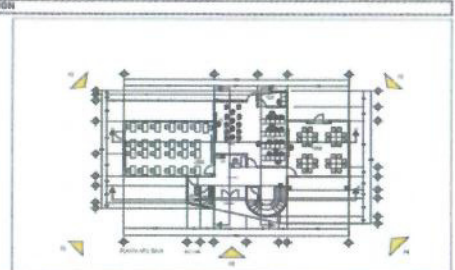

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO  
Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7, Paraje Titlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca



1.1. Substitución del acero de refuerzo total y trabes.



1.2. Eliminación de acero y cambio en losa y trabes.

Comentarios de los trabajos realizados:  
Muros de tabique planta alta, losa de azotea, aplomado fino, chubascado de elementos estructurales de concreto, fierros, fierros, salidas eléctricas



1.3. Área de recepción en fase de redacción y acabados.



1.4. Diseño de losa en concreto.



1.5. Instalación de tuberías y drenajes.

METROLOGÍA DE LOS AVANCES GENERALTA ARIAS  
*[Signature]*

ING. ARMANDO MARÍN NIETO  
ENC. DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, según el tipo de obra, durante y después de la obra. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma fotografía antes y después de la obra.



Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

UNCA  
Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2022

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reporte: **ENE-MAR/2023**  
Fecha de corte: 31/03/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL ESTADO DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance



**100%**

Proyecto: 2

Nombre de la obra:

**CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

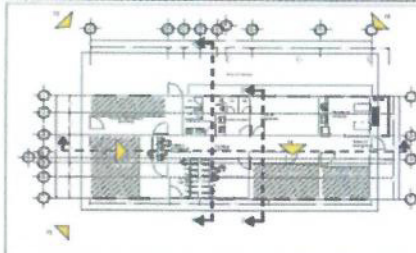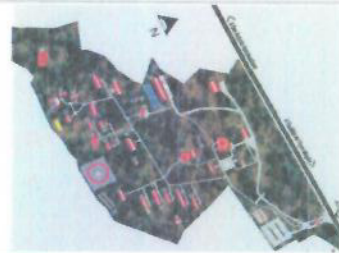

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km 1.7, Paraje Titlacuatzin, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1. Colocación de vigas y malla de acero para techado



F2. Colocación de control beams y contrabeams

Comentarios de los trabajos realizados:

Aplazado fino, chubasco de elementos estructurales de concreto, estructura de acero vigas IPB, Largas, contraflambas y contrasientos para techado



F3. Aplazado Fino, y colocación de vigas de acero para techado



F4. Aplazado Rio Exterior



F5. Aplazado del concreto armado (vigas, en contrabeams y contrasientos)

MTA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS  
Directora

ING. ARMANDO MARINIBETO  
ENC. DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todos los estados. Para ello se anexa una plantilla, en el formato de excel, en el apartado de "Anexo" de este informe. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la estampa total de la obra, en sus etapas de construcción, durante y después de la obra



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
