



# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

## VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”



Área:	Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.:	UNCA/VRAD/E-011/2025.
Asunto:	Informe del cuarto trimestre del FAM 2024.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 09 de enero de 2025.

**Doctora**

**Carmen Enedina Rodríguez Armenta**  
Directora General de Educación Superior  
Universitaria e Intercultural “DGESUP”  
Secretaría de Educación Pública

Presente:

Con At'n a: **Dr. Eduardo Gerardo Rosas González**  
Director de Fortalecimiento Institucional

En seguimiento al oficio número: 511/2024-0622-41 signado con fecha 07 de febrero de 2024 y por instrucciones de la Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Universidad de la Cañada; por este conducto me permito remitirle el informe de avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2024, correspondiente al trimestre octubre - diciembre, con fecha de corte 31 de diciembre de 2024, debidamente requisitado y digitalizado en formato PDF con su respectivo archivo en Excel.


Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formatos Excel y PDF, a los correos: dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx, sconde@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y claudia.duenas@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

*“praeteritum noscere, posterum molior”*

**L.C.E. Alfonso Martínez López**  
Vice-Rector de Administración



Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

Con copia para:

- Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias.- Rectora de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
  - Mtro. Farid Acevedo López.- Secretario de Finanzas del Estado de Oaxaca.- Para su conocimiento.
  - Mtra. Delfina Elizabeth Guzmán Díaz.- Secretaria de Educación del Estado de Oaxaca.- Mismo fin.
  - Lic. Emmanuel Alejandro López Jarquín.- Director General del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, OICIFED.- Mismo fin.
  - pas. C.P. Cristino Alberto Guerrero Hernández.- Representante Institucional, UNCA.- Mismo fin.
  - I.C. Armando Marín Nieto.- Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento, UNCA. Mismo fin.
- Archivo.





REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Cañada
Entidad federativa: OAXACA
Clave IFT: 2048100207

Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Teléfono: (236) 372 07 15, Ext.: 200
Correo electrónico: vice\_admin@unca.edu.mx

Nombre: ING. ARMANDO MARRÍN NETO
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Teléfono: (236) 372 07 15, Ext.: 208
Correo electrónico: supervisión-obras@unca.edu.mx



Main data table with columns for project details, financials, and progress. Includes rows for equipment delivery (ENTREGA DE EQUIPOS) and construction projects (AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERIA).

2024

FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:  
OCTUBRE - DICIEMBRE - 2024

Fecha de elaboración: 07/01/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Cañada  
Entidad federativa: OAXACA  
Clave SIT: 20MSLU002V

RESPONSABLES

Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Teléfono: (238) 372 07 15, Ext.: 200  
Correo electrónico: vice\_admin@unca.edu.mx

Nombre: MTR. ARMANDO MARÍN NIETO  
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
Teléfono: (238) 372 07 15, Ext.: 208  
Correo electrónico: supervision-obras@unca.edu.mx



ID	DESCRIPCIÓN DE METAS	X	M	C	D	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	MONTAJO	COSTO ESTIMADO	COSTO REALIZADO	COSTO RESERVA	COSTO TOTAL	PLANIFICACIÓN			Obras y Mantenimiento							
													TOTAL	1	145.99	0.00%	18/12/24	18/12/24	GLOBAL DEL PROYECTO	OBRA TERMINADA	EN PROCESO DE EJECUCIÓN		
3	ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA UN LABORATORIO CLÍNICO UNIVERSITARIO.	X				09/10/2024	07/13/2024	\$ 888,734.61	\$ 888,734.61	\$ -	\$ -	\$ -	1	1	0.00	100.00%	09/10/24	07/13/2024	OBRA TERMINADA	\$ 1,000,000.00	30/12/2024	\$ 1,000,000.00	30/12/2024
						08/13/2024	22/12/2024	\$ 111,265.39	\$ 111,265.39	\$ -	\$ -	\$ -							OBRA TERMINADA				
5	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X				14/10/2024	11/01/2025	\$ 1,234,447.63	\$ 316,333.40	\$ -	\$ 916,114.43	\$ -	1	13	0.00	47.00%			EN PROCESO DE EJECUCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						12/01/2025	03/02/2025	\$ 146,273.17	\$ -	\$ -	\$ 146,273.17	\$ -							EN PROCESO DE EJECUCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
								\$15,435,528.25	\$15,177,799.18	\$297,729.07	\$3,911,626.22	\$11,266,172.96											



OBRAS  
*[Handwritten signature]*

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



PLANIFICACIÓN  
*[Handwritten signature]*  
L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



RECTORÍA  
*[Handwritten signature]*  
MTRA. MARIA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS.

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

1 Se capturan los espacios en blanco que sean necesarios.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se vanen reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.



2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta  
OCTUBRE - DICIEMBRE - 2024

Fecha de elaboración: 07/01/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

10.53%

Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.


FOTOS



SISTEMAS CONTROL DE DAJACA, S.A. DE C.V.-



F2. LABORATORIO CLÍNICO UNIVERSITARIO



Observaciones :



F3. LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN



F4. LABORATORIO DE QUÍMICA



F5. LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

OBRAS  
ING. ARMANDO MARÍN NIETO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.



PLANEACIÓN Y VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN  
L.C. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA  
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PENALTA ARIAS.

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE  
OTORGÓ EL RECURSO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:  
**OCTUBRE - DICIEMBRE -  
2024**

Fecha de elaboración: 07/01/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

**15.00%**

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiltlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



TRAZO, LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO



EXCAVACIÓN DE CIMENTOS POR MEDIOS MECÁNICOS

Observaciones:



EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO C



HABILITADOR DE ACERO PARA ZAPATAS, TRABES DE LIGA Y TRABES DE LOSA



HABILITADOR DE ACERO PARA ZAPATAS, TRABES DE LIGA Y TRABES DE LOSA

OBRAS  
ING. ARMANDO MARIN NIETO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, COSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
VICERECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN  
L.O. MARTÍN MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA  
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Universidad de la Cañada  
VICERECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

Este es un reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:  
OCTUBRE - DICIEMBRE - 2024

Fecha de elaboración: 20/01/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance  
**15.00%**

PRORIDAD 2 Nombre de la obra: **AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



COLADO DE PLANTILLAS DE CIMENTACIÓN




COLOCACIÓN Y CUBRADO DE CIMENTOS DE ZAPATAS CORRIDAS Y AISLADAS

Observaciones:



COLOCACIÓN Y CUBRADO DE CIMENTOS, ZAPATAS CORRIDAS Y AISLADAS

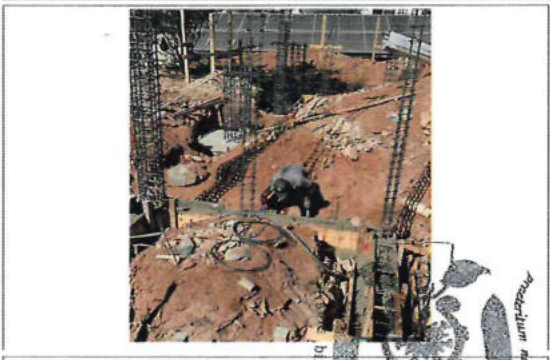

COLOCACIÓN Y CUBRADO DE CIMENTOS, ZAPATAS CORRIDAS Y AISLADAS



COLOCACIÓN Y CUBRADO DE CIMENTOS, ZAPATAS CORRIDAS Y AISLADAS

OBRAS  
ING. ARMANDO MARÍN TRISTE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN  
MANTENIMIENTO.

ADMINISTRACIÓN  
L.C.E ALFONSO MARTÍNEZ LOPEZ  
VICE RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA  
MITRA MARIA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS.

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:  
OCTUBRE - DICIEMBRE - 2024

Fecha de elaboración: 07/01/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

100.00%

PRIOIDAD: 3 Nombre de la obra: ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA UN LABORATORIO CLÍNICO UNIVERSITARIO.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



REMOCIÓN DE LOSETA.



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
LABORATORIO CLÍNICO UNIVERSITARIO  
23.10.2024 13:25  
18.13668, -97.09738  
Altitud: 893m

EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS Y ELÉCTRICAS.

Observaciones:



APLICACIÓN DE PASTA FINA EN MUROS.

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
LABORATORIO CLÍNICO  
06.11.2024 09:11  
18.13668, -97.09738  
Altitud: 893m



COLOCACIÓN DE LOSETA.




COLOCACIÓN DE MALLA Y PLAFONES DE BARRICK.

OBRA: [Signature]  
ING. ARMANDO MARIN NIETO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

COORDINACIÓN: [Signature]  
LIC. ALFONSO MARTINEZ ROSAS  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

RECTORIA: [Signature]  
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.



Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para el equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



2024

ESERCICIO FISCAL EN EL QUE QUORÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta  
OCTUBRE - DICIEMBRE - 2024

Fecha de elaboración: 07/01/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIMERÍA: 3 Nombre de la obra: ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA UN LABORATORIO CLÍNICO UNIVERSITARIO.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

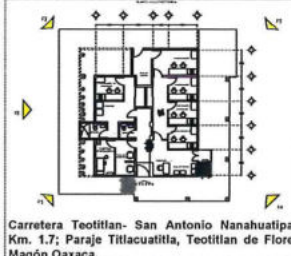

Carretera Teotitlán- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatilla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.



Porcentaje de avance

100.00%

FOTOS



MUROS Y PLAFONES DE ENRIQUE Y CABLEADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.



PINTURA EN MUROS Y PLAFONES

Observaciones:



COLOCACIÓN DE CAJERERÍA.



PINTURA EXTERIOR Y ACABADOS FINALES EN OBRA INTERIORES



OBRA TERMINADA.

OBRA  
ING. ARMANDO MARIÑO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

COORDINACIÓN  
LIC. ALICIA MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDA  
MTRA. MARIA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS.

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA



2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE  
GIORGIO EL RECURSO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta  
**OCTUBRE - DICIEMBRE -  
2024**

Fecha de elaboración: 07/01/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Universidad de la Cañada Porcentaje de avance <b>47.00%</b>	PRIORIDAD: <b>5</b> Nombre de la obra: <b>MANTENIMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.</b>	<b>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</b> 	<b>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</b> 	<b>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</b>  Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatilla, Teotitlan de Flores Maqón Oaxaca.
--	---	---	--	---

FOTOS

 RICO DE OBRA, DESMONTAJE DE MUEBLES SUETADOS	 DEMOLICIÓN DE MUROS Y PISOS.	Observaciones:
 HABILITADO, DIMBRADO Y CILINDRO DE ESTRUCTURA PARA MURO DE TABIQUE K100.	 MURO DE TABIQUE K100 Y PREPARACION DE SALIDAS PARA MANTENIMIENTO.	 APLANADO DE MURO
OBRAS ING. ARMANDO MARIN NIETO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.	OBRAS LIC. ALFONSO MARTINEZ LOPEZ COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	RECIPIENTE SRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.

UNCA  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

NOTA:

Para cada obra que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

UNCA  
Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

UNCA  
Universidad de la Cañada

RECTORÍA



2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE  
GRUPO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta  
OCTUBRE - DICIEMBRE -  
2024

Fecha de elaboración: 07/01/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD: 5 Nombre de la obra: MANTENIMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Porcentaje de avance

47.00%



Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiltlacuatilla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



PROYECTO DE OBRA. DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS



EDIFICACIÓN DE AZULEJO Y LOSETA

Observaciones:



DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS



MURD PARA BASES DE TUBOS





CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS

OBRAS  
ING. ARMANDO MARIN SUETO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

COORDINACIÓN  
L.C. ALFONSO MARTÍNEZ LOPEZ  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

REGISTRO  
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.



Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para el levantamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:  
OCTUBRE - DICIEMBRE - 2024

Fecha de elaboración: 07/01/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRORIDAD 5 Nombre de la obra: MANTENIMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.



Porcentaje de avance

47.00%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Maqón Oaxaca.

FOTOS



COLOAN DE BAZES PARA TRACOS



UTM: 14Q  
131 5240E 2006275mN  
Elevación: 846.2842 m  
Precisión: 5.3 m  
Tiempo: 10-12-2024 18:21  
Poda: Mantenimiento gral.

COLOCACIÓN DE LAVES ECONOMIZADORAS

Observaciones:



COLOCACIÓN DE MUEBLES WC



INSTALACIÓN DE LAVABOS



INSTALACIÓN DE MINGUINOS

ING. ARMANDO MARRIÑELLO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

ING. ALFONSO MARRIÑELLO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

RECTORA  
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Para el presente se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA
