



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

Oficio No.: VRAD/E/294/2018.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 10 de diciembre de 2018.

**DOCTORA**  
**CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA**  
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA "DGESU"  
P R E S E N T E:

Por este conducto y en atención al oficio número 511-3/2018.-0511 de fecha 23 de mayo de 2018 y en alcance al similar número 511/2015.-0373 envió el informe de los avances con fecha corte 30 de noviembre de 2018, de las obras apoyada a través del Recurso FAM 2018. (anexo CD con información magnética)

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos [rocioc@nube.sep.gob.mx](mailto:rocioc@nube.sep.gob.mx), [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx) y [jcarlosv@nube.sep.gob.mx](mailto:jcarlosv@nube.sep.gob.mx)

Sin otro particular, le reitero mi más distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

*"praeteritum noscere, posterum molior"*



  
L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.  
ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL.- Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.- Para su conocimiento y seguimiento.  
- Archivo.

2018



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
noviembre\_2018  
FECHA DE CORTE 30/11/2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre Universidad de la Cañada  
Entidad federativa: Oaxaca  
Clave Inst 011\_20AS00032V

RESPONSABLES

Planación  
Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Teléfono: (296) 372 07 15, Ext. 200  
Correo electrónico: vira\_admin@unca.edu.mx

Obras y Mantenimiento  
Nombre: APO MELANY CUEVAS MARCEL  
Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
Teléfono: (296) 372 07 15 Ext. 208  
Correo electrónico: melany20@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Monto autorizado, Monto ejercido, Remanente, Alcance del proyecto, Acciones que sustentan el avance, Acciones por realizar, % de avance, Fechas (Inicio, Término), Observaciones, ¿Es susceptible de ser inaugurada?, ¿Cuánta con fotos del evento?, ¿Quién y cuándo inauguró?, Entrega-Recepción (Acta finalizado), Acta Administrativa de Entrega-Recepción, Monto de Acta Administrativa.

DR. MODESTO REARA VAQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de IES  
APO MELANY CUEVAS MARCEL

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanto fotos como sea necesario.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos o acciones, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en sus siglas, día, mes y año.

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA



2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**noviembre\_2018**  
FECHA DE COREE: 30/11/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

Nombre de la obra: **Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

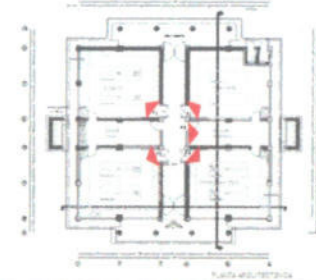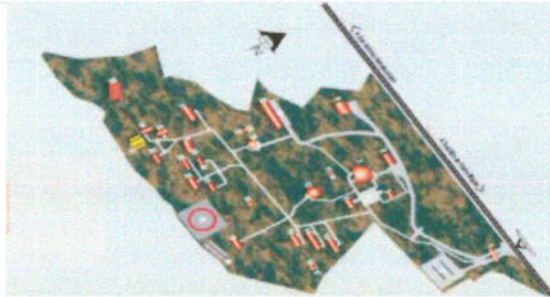

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tlilacuatlilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Vista Interior Inorgánica



F2: Vista Interior Instrumental

Comentarios de los trabajos realizados:  
Aun no se tienen trabajos realizados, debido a que el estatus de la obra se encuentra "en proceso Administrativo"



F3: Vista Interior Almacén de Reactivos



F4: Vista Interior Bromatología/Micro



F5: Vista Interior Orgánica

DR. MODESTO RIVERA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ARIEL NELSON OLIVERA SAMUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture en misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**noviembre\_2018**  
FECHA DE COPIA: 2018/11/14

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avanos

0

Presupuesto: 2 Nombre de la obra: **Mantenimiento de diversas areas de la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACION

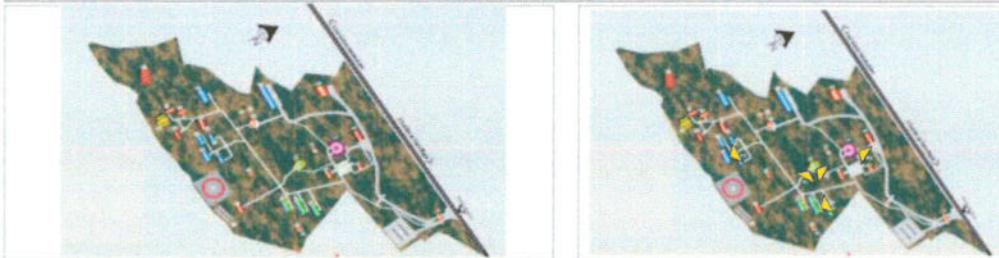

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7: Paraje Tiltacuatlilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS




F1: Fachada principal Biblioteca



F2: Area Superior de Biblioteca para instalar Domo

Comentarios de los trabajos realizados:

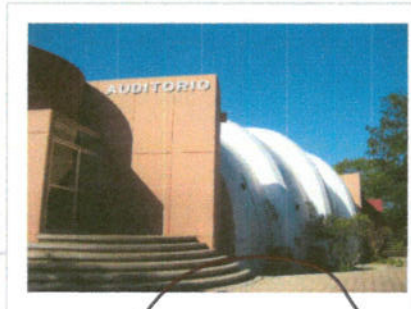

F3: Fachada Auditorio



F4: Puertas CAPCE del edificio de Aulas



F5: Fachada Centro de Ciencias

DR. ROBERTO SERRA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

[Signature]

Nombre y firma del Jefe de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se deben copiar tantas fotos como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo angulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE ORIENTAMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FIECA

Mes reportado:  
**noviembre\_2018**  
Fecha de corte de: 30/11/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

PROYECTOS 3 Nombre de la obra: **Construcción de una Cancha de Usos Múltiples, en la Universidad de la Cañada.**

GRUPOS DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tidscuttla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo en columnas



F2: Acero de refuerzo en columnas en zapatas aisladas y colado de planilla

**Comentarios de los trabajos realizados:**  
Con fecha 23 de octubre de 2018 se dio inicio a los trabajos de la construcción de la cancha de usos múltiples, se realizó el desplante, limpieza, trazo y nivelación, se inició la excavación y se suministraron materiales como acero de refuerzo y tubos.  
Se habilitó el acero para zapatas aisladas, columnas, zapatas corridas, contratabres, cadenas y castillos, se colocaron zapatas, contratabres, dados, cadenas y castillos y se armó el muro de 28 cm.



F3: Muro de cimentación, zapatas corridas y columnas, contratabres, cadenas y castillos



F4: excavación



F5: habilitado y armado de acero de refuerzo en columnas y zapatas

DR. VICENTE HERRERA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se entregue reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa un CD con fotos, se puede complementar con videos cuando sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture en el mismo lugar, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

**Universidad de la Cañada**  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**noviembre\_2018**  
PÁGINA DE 20 DE 36

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




UNCA  
Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0

PERIODO: 8 Nombre de la obra: **Reemplazo de Boilers de gas por Calentadores solares e implementación de Wathorímetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

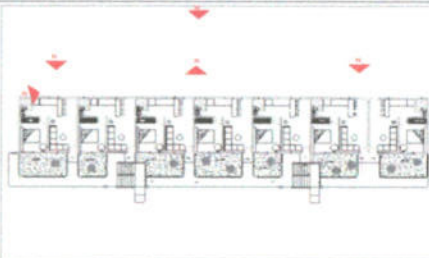

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Titicuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS




F1: Fachada posterior del edificio



F2: Fachada posterior lado poniente

Comentarios de los trabajos realizados:  
Se concluyó el proceso de focalización, se adquirieron los equipos y materiales por lo que estamos en espera de la entrega de los mismos para dar inicio a la instalación de los mismos.



F3: Área para instalación de Wathorímetros



F4: Fachada posterior



F5: Perspectiva focalización

DR. LUIGENTO IBARRA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

[Signature]  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una carpeta con fotos de cada una de las etapas de la obra, como mínimo, antes, durante y después de la obra. Para equipamiento, mantenimiento y reparaciones, en especial, se recomienda que se capturen fotos en el mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA



UNCA  
Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
