



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Área:	Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.:	VRAD/E/083/2020.
Asunto:	Informe trimestral del FAM 2019-2020.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 15 de mayo de 2020.

DOCTORA
CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA "DGESU"
P R E S E N T E:

En atención al oficio número: 511/2020.-0854-38 de fecha 13 de febrero de 2020 y según el Tercer Comunicado a Universidades Públicas Estatales, Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario y Universidades Interculturales ante la contingencia-Covid 19; por este conducto me permito enviarle el informe de avance correspondiente al trimestre enero-marzo, con fecha corte 30 de marzo de 2020, de las obras apoyadas a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2019 (anexo CD con información magnética).

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE

"praeteritum noscere, posterum molior"

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ.- Director de Fortalecimiento Institucional.- Para su conocimiento.
Archivo.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad de la Cañada**
Entidad federativa: **Oaxaca**
Clave Inst 911: **20MBU0052V**



Presidencia

Nombre: **L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ**
Cargo: **VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN**
Teléfono: **(236) 372 07 15, Ext.: 200**
Correo electrónico: **vica_admin@unca.edu.mx**

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento
Nombre: **ARG. MELANY CUEVAS MANUEL**
Cargo: **JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**
Teléfono: **(236) 372 07 15, Ext.: 208**
Correo electrónico: **supervision-obras@unca.edu.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Cuenta con Actas				
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustantivado				Especie/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
0	Construcción de un Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación en la Universidad de la Cañada (C.I.N.A.)	X					\$ 5,042,429.96	\$ 5,042,429.96	\$ -	C.I.N.A.	1	547.42	se construyó en planta alta con Muros de tabique de 14, colado de columnas, colado de muros, habilitado de acero de refuerzo en traves, depuras para salidas de instalaciones, colado de losa de azotea, aplomado de muros, pisos de boveda, muros de alaje, carpentería, muebles de baño, instalaciones, eléctricas, hidrosanitarias, gas, etc.	Obra concluida	100%	03/09/19	28/02/20	Obra concluida. FAM 2019	NO, DEBIDO A QUE SE CONCLUYÓ SOLO LA PRIMERA ETAPA.	-	-	SI	SI	\$5,042,429.96
1	TÉRMINACIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA (C.I.N.A.)	X					\$ 1,733,607.00	\$ -	\$ 1,733,607.00	C.I.N.A.	1	547.42			0%	08/06/20	05/09/20	En Proceso de Administrativo.	NO	-	-	NO	NO	\$0.00
2	EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA (C.I.N.A.)	X					\$ 4,447,001.00	\$ -	\$ 4,447,001.00	MOBILIARIO Y EQUIPO	199	PIEZAS			0%	-	-	En Proceso de Administrativo.	NO	-	-	NO	NO	\$0.00
3	TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO PARA AULAS DE DOS NIVELES CON ANEXO SANITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X					\$ 3,952,896.00	\$ -	\$ 3,952,896.00	ALIAS Y ANEXO SANITARIO	1	646.10			0%	04/05/20	11/09/20	En Proceso de Administrativo.	NO	-	-	NO	NO	\$0.00
4	EQUIPAMIENTO Y REEMPLAZO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X					\$ 1,304,189.00	\$ -	\$ 1,304,189.00	EQUIPAMIENTO	18	EDIFICIOS			0%	-	-	En Proceso de Administrativo.	NO	-	-	NO	NO	\$0.00
6	ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO DEL TALLER DE ALIMENTOS Y DEL LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X					\$ 602,246.00	\$ -	\$ 602,246.00	ADICUACION EN TALLER DE ALIMENTOS Y FARMACOLOGIA	1	277.00			0%	-	-	En Proceso de Administrativo.	NO	-	-	NO	NO	\$0.00
							\$17,082,371.96	\$5,042,429.96	\$12,039,942.00															

DR. MOJESTO SANCHEZ VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

ARG. MELANY CUEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se pueden anotar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, día, mes y año.

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ene-mar/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

100

PRORIDAD **0** Nombre de la obra: **Construcción de un Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación en la Universidad de la Cañada (C.I.N.A.)**

GRUPO DE LOCALIZACIÓN

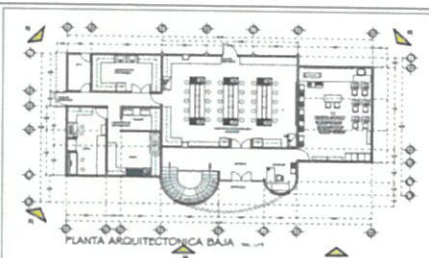

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiliacustitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Cimentación



F2: Faldón posterior, pláticas, aplacados.

Comentarios de los trabajos realizados:
Otra concluida.



F3: Cimentación, aplacados.



F4: Cimentación, aplacados, faldón principal.



F5: Interior de la obra.

Nombre y firma del Titular de la IES:

ROBERTO BEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES:

MANUEL CUESTE MANUEL

* Es muy importante que se envíe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se recomienda que se capturen tantas fotografías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture el mismo lugar y ángulo para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada
RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ene-mar/2020
FECHA DE CORTE 31/03/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance
0

PRIMORDIAL 1 Nombre de la obra:

TÉRMINACION DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA (C.I.N.A)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

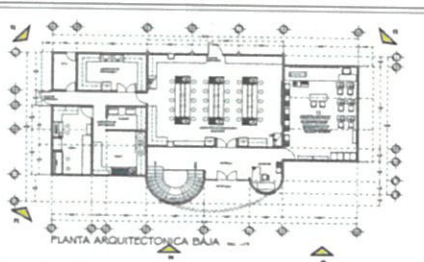

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

En proceso Administrativo

En proceso Administrativo

Comentarios de los trabajos realizados:

En proceso Administrativo


En proceso Administrativo

En proceso Administrativo

DR. MODESTO BEARA VÁZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

ING. MELANY CUEVAS MAJUEL
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se programan cuantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



Universidad de la Cañada
RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2020



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Mes reportado
ene-mar/2020
FECHA DE CORTE: 31/03/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIMORDIA 2 Nombre de la obra: **EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA (C.I.N.A.)**

CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN

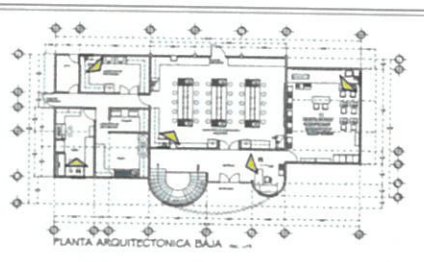

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlán-San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiltacuastla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

Porcentaje de avance
0

FOTOS

En proceso Administrativo

En proceso Administrativo

Comentarios de los trabajos realizados:

En proceso Administrativo

En proceso Administrativo

En proceso Administrativo

DR. ROBERTO BEARA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES



ARG. MELANY CUEVAS MANUEL
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una página, se podrán copiar tantas páginas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ene-mar/2020
FECHA DE CORTE: 31/03/2020


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance
0

PRIMORDIA **3** Nombre de la obra: **TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO PARA AULAS DE DOS NIVELES CON ANEXO SANITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

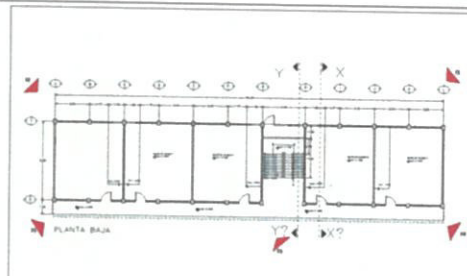

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7. Paraje Tlilecuatitla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

En proceso Administrativo

En proceso Administrativo

Comentarios de los trabajos realizados:

En proceso Administrativo

En proceso Administrativo

En proceso Administrativo

DR. MOESTO BEANA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES



ARACELY CUEVAS MANUEL
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ene- mar/2020

FECHA DE CORTE: 31/03/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRORIDAD

4

Nombre de la obra:

EQUIPAMIENTO Y REEMPLAZO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.

GRUPOS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatlpan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0

FOTOS

En proceso Administrativo

En proceso Administrativo

Comentarios de los trabajos realizados:

En proceso Administrativo

En proceso Administrativo

En proceso Administrativo

DR. MODESTO BEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES



ARIQ. MELANY GUEVYS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña se podrán capturar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ene-mar/2020
FECHA DE CORTE: 31/03/2020


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance
0

Nombre de la obra: **ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO DEL TALLER DE ALIMENTOS Y DEL LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD**

ORDEN DE LOCALIZACIÓN

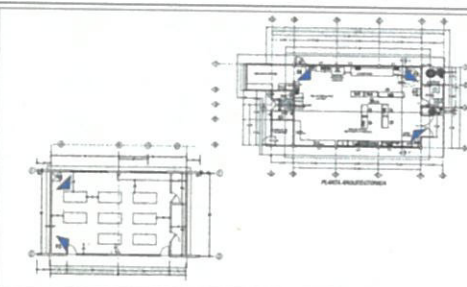

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlán-San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatilla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

En proceso Administrativo

En proceso Administrativo

Comentarios de los trabajos realizados:

En proceso Administrativo

En proceso Administrativo

En proceso Administrativo

DR. MODESTO BEARA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES



ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que el CENIT y el personal de mantenimiento, estén presentes en todo momento y lugar, para el antes, durante y después de la obra.

RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
