



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



Área: Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.: UNCA/VRAD/E-017/2026.
Asunto: Entrega de informe del cuarto trimestre del FAM 2025.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 09 de enero de 2026.

Maestra

Cynthia Ruano Méndez

Directora de Fortalecimiento Institucional

Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural

Secretaría de Educación Pública

P r e s e n t e:

En seguimiento al oficio número: 511/2025-0575-42 signado con fecha 18 de febrero de 2025 y por instrucciones de la Dra. Margarita Bernabé Pineda, Encargada de Despacho de la Universidad de la Cañada; por este conducto me permito remitirle el informe de avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2025, correspondiente al trimestre octubre-diciembre, con fecha de corte 31 de diciembre de 2025, debidamente requisitado y digitalizado en formato PDF con su respectivo archivo en Excel.

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formatos Excel y PDF, a los correos: dgi.dgesui@nube.sep.gob.mx, sconde@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, claudia.duenas@nube.sep.gob.mx y andrea.rangel@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"praeteritum noscere, posterum molior"
L.C.E. Eugenio Cortés Hernández
Vice-Rector de Administración



Con copia para:

Dra. Margarita Bernabé Pineda.- Encargada de Despacho de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.

I.C. Armando Marín Nieto.- Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento, UNCA. Misma fin.

Archivo.

2025

ESTADO FEDERAL EN EL QUE
SE UBICA LA UNIDAD

Nombre: Universidad de la Cañada

Entidad federativa: OAXACA

Clave 911: 20MSU0032V

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Periodo y año que se reporta

Octubre - Diciembre - 2025

Fecha de elaboración: 09/12/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Cañada

Entidad federativa: OAXACA

Clave 911: 20MSU0032V

Nombre: L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ

Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Teléfono: (296) 372 07 15, Ext.: 200

Correo electrónico: vice_admin@unca.edu.mx

Titulares de Áreas

Nombre: ING. ARMANDO MARÍN NIETO

Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Teléfono: (296) 372 07 15, Ext: 208

Correo electrónico: supervisión-obras@unca.edu.mx

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Planes					Titulares de Áreas			Obras y Mantenimiento			OBRAS CONCLUIDA										
			CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA					REMANTES			Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)			Acciones que sustituyen el avance	% de avance	Fechas Reales (DOMINIA)		Observaciones	Reintegro a la TESOF			Actas		
			No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas	Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado(G) Diferencia entre rectificado y Contratado C=A-B	Monto ejecutado (D)	(E1) Diferencia entre Monto Autorizado y Monto ejecutado E1=A-D	(E2) Diferencia entre Monto contratado y Monto ejecutado E2=G-B	Nombre del Equipo/Equipo	Cantidad	Metros Cuadrados (m²)			Inicio	Término		Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	Entrega Recisión (Acta firmada)	Fecha	Acta Administrativa de Entrega Recisión (formato DOESU) MONTO
			BAC0074-0202-43705447709	18/12/2025 18/6/2025	\$ 32,833.86	COMERCIALIZADOR DE MATERIALES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		\$ 32,833.86	\$ 28,881.72	\$ 2,023,107.79	\$ 6,184,335.42	\$ 6,138,833.70												
					\$ 8,187,443.21																			

ING. ARMANDO MARÍN NIETO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
 L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

1 Se capturan las reacciones que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas líneas como sea necesario.
 2 En esta sección se redactara de forma libre y correcta los trabajos a realizar, informes que se verán reflejados en el reporte final.
 3 Es importante que los fechas de inicio y término estén actualizadas. Tanto en dos dígitos del mes ya

DRA. MARGARITA BERNAL PINEDA

ENCARGADA DE ENVÍO

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada
 VICE-RECTORÍA DE
 ADMINISTRACIÓN

2025


FAMEJERCICIO FISCAL EN EL QUE
SE GESTÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
Octubre - Diciembre - 2025
 Fecha de elaboración: 09/01/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Universidad de la Cañada	Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titiacuatitla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.
Porcentaje de avance				
78.00%				

FOTOS



Universidad de la Cañada
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

OBRAS
 ING. ARMANDO MARÍN NIETO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y
 MANTENIMIENTO.

ENCARGADA DE DESPACHO
 DRA. MARGARITA BERNALDEZ PINEDA

PLANEACIÓN
 C.P. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada

**VICE-RECTORÍA DE
 ADMINISTRACIÓN**

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

2025

FAM

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
Octubre - Diciembre - 2025
Fecha de elaboración: 09/01/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO		Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS	
	Universidad de la Cañada					
Porcentaje de avance		78.00%			Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatlán Km. 1.7; Paraje Titlacuacita, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.	

FOTOS			
		Observaciones:	



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

OBRES
ING. ARMANDO MARÍN NIETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO.

ENCARGADA DE DESPACHO
DRA. MARÍA RITA BERNAL PINEDA

PLANEACIÓN
L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**


FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
Octubre - Diciembre - 2025

Fecha de elaboración: 09/01/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

	PROGRESO Porcentaje de avance 78.00%	1 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA. GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titacuacatlí, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.	
--	--	--	--	--	--	--	--

		Observaciones :
Molino Pulverizador	Parrilla De Calentamiento con Agitación	

		
Refrigerador para Alimentos	Sistemas de Aire Acondicionado 5,000 Btu's	Switch Core Administrable Capa 3 Con 24 P.

Universidad de la Cañada
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

NOTA:

* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

OBRAS
 INS. ARMANDO MARÍN NIETO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y
 MANTENIMIENTO.

ENCARGADA DE DESPACHO
 DRA. MARGARITA BERNALDE PINEDA

PLANEACIÓN
 L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

2025

FAMEXERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGA EL RECURSO


FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trempster y año que se reporta:
Octubre - Diciembre - 2025

Fecha de elaboración: 09/01/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO		Nombre de la obra:	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS	
		GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	
					
					
				<p>Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titicuatitla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.</p>	

FOTOS		
		Observaciones :
Estufón Industrial	Desecador	

	
Incubadora con Agitación Orbital	Deshidratador

Universidad de la Cañada
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

OBRAS
 ING. ARMANDO MARÍN NIETO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y
 MANTENIMIENTO.

ENCARGADA DE DESPACHO
 DRA. MARÍA MARGARITA BERNARDE PINEDA

PLANEACIÓN
 L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada
 VICE-RECTORÍA DE
 ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada
 RECTORÍA

2025

FAM

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGO EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
Octubre - Diciembre - 2025

Fecha de elaboración: 09/01/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO

Nombre de la obra:

CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.




Porcentaje de avance

30.00%

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



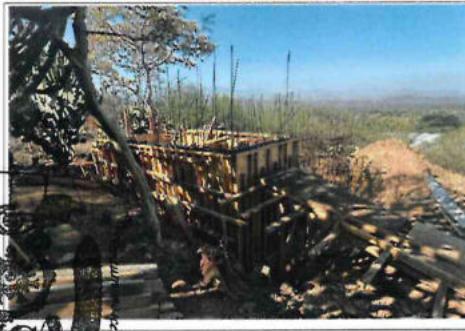
Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuacatlí, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

Observaciones:



Cimbra en muros de Cisterna



Cimbra en muros de Cisterna



Cimbra en sedimentador 1



Cimbra en sedimentador 1



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Anexo reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestalla, se podrán copiar tantas pestallas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

OBRAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO.

ING. ARMANDO MAURÍCIO NIETO

ENCARGADA DE DESPACHO
DRA. MARGARITA BERNABÉ PINEDA

PLANEACIÓN
L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

2025

FAM

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGO EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
Octubre - Diciembre - 2025

Fecha de elaboración: 09/01/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO: 2 Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.



Porcentaje de avance

30.00%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tlaticuatitlán, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



Observaciones :

Concreto Cisterna



Concreto Cisterna



Concreto Sedimentador 1

OBRA:

ING. ARMANDO MARÍN NIETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO.

ENCARGADO DE DESPACHO
DRA. MARGARITA BERNARDE PINEDA

PLANEACIÓN
L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

NOTA:

* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

2025


EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGO EL RECURSO**FAM**


FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
Octubre - Diciembre - 2025
 Fecha de elaboración: 09/01/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Universidad de la Cañada	PROYECTO 1 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, AMPLIACIÓN DE METAS.		GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuacatlí, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.	
Porcentaje de avance								
0.00%								

		FOTOS 	
Observaciones: EN PROCESO DE ENTREGA			



Universidad de la Cañada


DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

OBRAS	
ING. ARMANDO MARTÍNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.	

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

ENCARGADA DE DESPACHO		PLANEACIÓN
DRA. MARGARITA BERNABEU		L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada

RECTORÍA
