



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA RECTORÍA

"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN"



Oficio No.: REC/220/2026.

Asunto: Entrega de informe del tercer trimestre del FAM 2026.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 9 de octubre de 2026.

Mtra. Cinthya Ruano Méndez

Directora de Fortalecimiento Institucional

Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural

Secretaría de Educación Pública

P r e s e n t e:

En seguimiento al oficio núm. 511/2026-0587-40 de fecha 23 de febrero de 2026, por este conducto me permito remitir el informe de avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2026, correspondiente al trimestre julio-septiembre, con fecha de corte 30 de septiembre de 2026.

Así mismo hago de su conocimiento que el reporte actualizado en formatos Excel y PDF fue enviado a los correos electrónicos: **dfi.dgesui@sep.gob.mx**, **sconde@sep.gob.mx**, **jcardona@sep.gob.mx**, **andrea.rangel@sep.gob.mx** y **claudia.duenas@sep.gob.mx**.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"praeteritum noscere, posterum melior"


Dra. Margarita Bernabé Pineda

Rectora

rectoria@unca.edu.mx

236 372 0747 Ext. 100 RECTORÍA



Con copia para:

L.C.E. Eugenio Cortes Hernández.- Director Administrativo.- Para su conocimiento y seguimiento.

I.C. Armando Marín Nieto.- Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento UNCA.- Mismo fin.

Archivo.

2026

FAM
FONDO DE APORTE MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
Julio - Septiembre / 2025

Fecha de elaboración del informe

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Cañada
Entidad federativa: OAXACA
Código BTL: 200000020

Nombre: L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Teléfono: (236) 372 07 15, Ext. 208
Correo electrónico: direccion.administrativa@unca.edu.mx

Nombre: ING. MUÑOZ MONTENEGRO
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Teléfono: (236) 372 07 15, Ext. 208
Correo electrónico: supervision-obras@unca.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto Autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO					Monto ejercido (D)	REMANENTES		Explosivos (falcone) (programa de la autoridad)			Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas Reales (D.O.M.B.A.A)		Observaciones	Recepción a la TESOFE			Actas				
	Obras de infraestructura	Obras de conservación	Equipamiento	Administración y gestión	Bancos		No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)	Contratista o Proveedor		Monto no Contratado (C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B	(E1) Diferencia entre Monto Autorizado y Monto ejercido E1 =A-D	(E2) Diferencia entre Monto contratado y Monto ejercido E2 =B-D	Nombre del Expediente	Cantidad			Monto Contratado (n°)	Inicio		Término	Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	Entrega-Recepción (Acta Inicial) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (Formulario D.O.S.B.U) MONTO	Fecha
								INICIO	TERMINO																					
AMPLIACIÓN DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS ESCOLARES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA																														
				X		\$	2,810,000.00				\$		\$	2,810,000.00	\$		\$	2,810,000.00	\$		0.00%			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN						
						\$	2,810,000.00				\$		\$	2,810,000.00	\$		\$	2,810,000.00	\$		0.00%			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN						
ADECUACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA																														
				X		\$	1,292,000.00				\$		\$	1,292,000.00	\$		\$	1,292,000.00	\$		0.00%			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN NORMATIVA						
																											</			

OBRAS Y MANTENIMIENTO

ING. ARMANDO MARÍN NIETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

RECORTA
DRA. MARGARITA BERNABÉ
DIRECTORA

PLANIFICACIÓN
L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNCA
Universitat de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

UNCA
Universidad de la Cañada
RECTORÍA

UNCA
Universidad de la Cañada
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICATrimestre y año que se reporta:
Julio - Septiembre / 2026

Fecha de elaboración: 08/10/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance


0.00%

Nombre del proyecto: AMPLIACIÓN DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS ESCOLARES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

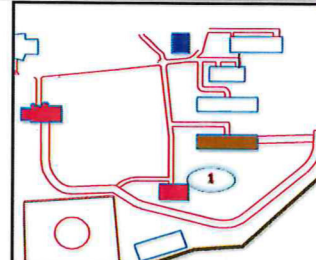

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: CARRILERA TEOTITLÁN-SAN ANTONIO NANAHUATIPÁN KM. 1.7, S/N, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA.

FOTOS

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

Observaciones:

JEFE DE CARRERA 1
SERVICIOS ESCOLARES
VESTÍBULO
SALA DE JUNTAS
OFICINA PARA LA JEFATURA
JEFE DE CARRERA 2
BAÑOS

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

OBRAS Y MANTENIMIENTO

ING. ARMANDO MARÍN NIETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.DRA. MARGARITA BERNABÉ PINEDA
RECTORAL.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Universidad de la Cañada

RECTORÍA



DIRECCIÓN

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Julio - Septiembre / 2026

Fecha de elaboración: 09/10/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

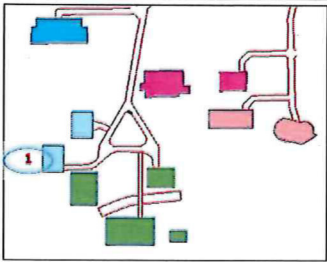 Porcentaje de avance 0.00%	Prioridad: 2 Nombre del proyecto: ADECUACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  Dirección Postal: CARRETERA TEOTITLÁN-SAN ANTONIO NANAHUATIPAN KM. 1.7, SIN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA.
---	---	--	---	---

FOTOS

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

Observaciones :

(11)

CUARTO PARA REACTIVOS PARA LABORATORIO DE BIOLOGÍA
LABORATORIO DE BIOLOGIA

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

OBRAS Y MANTENIMIENTO

ING. ARMANDO MARÍN NIETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO.DRA. MARGARITA BERNABE PINEDA
RECTORA

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


Universidad de la Cañada
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICATrimestre y año que se reporta:
Julio - Septiembre / 2026

Fecha de elaboración: 08/10/2026

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0.00%

PRIORIDAD

2


Nombre del proyecto:

ADECUACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

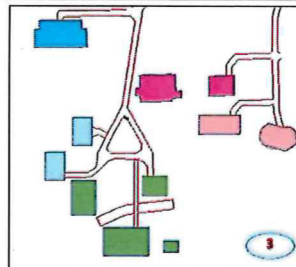

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: CARRETERA TEOTITLÁN-SAN ANTONIO NANAHUATIPÁN KM. 1.7, S/N, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA

FOTOS

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

Observaciones :

CUARTO PARA ALMACENAMIENTO PARA RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS RQP

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

UNCA
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

Unidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

OBRAS Y MANTENIMIENTO

ING. ARMANDO MARÍN NIÑO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO.DRA. MARGARITA BERNABÉ PINEDA
RECTORA

RECTORÍA

PLANEACIÓN

L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVODIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Julio - Septiembre / 2026

Fecha de elaboración: 05/10/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0.00%


PRIORIDAD 2

Nombre del proyecto: ADECUACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

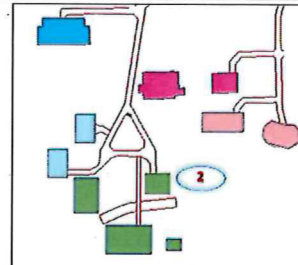

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: CARRETERA TEOTITLÁN-SAN ANTONIO NANAHUATIPÁN KM. 1.7, S/N, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA

FOTOS

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

Observaciones:

CUARTO PARA REACTIVOS PARA LABORATORIO DE QUÍMICA

LABORATORIO DE QUÍMICA

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

UNCA
Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

OBRAS Y MANTENIMIENTO

ING. ARMANDO MARÍN NIETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, COSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO.RECTORÍA
DRA. MARGARITA GONZÁLEZ PINEDA
RECTORAPLANEACIÓN
L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
