



# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

## VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”

Área:	Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.:	UNCA/VRAD/E-207/2023.
Asunto:	Informe trimestral del FAM 2023.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 10 de julio de 2023.

Doctora

**Carmen Enedina Rodríguez Armenta**  
Directora General de Educación Superior  
Universitaria e Intercultural “DGESUI”  
Secretaría de Educación Pública  
Presente:

Con At'n a: **Dr. Eduardo Gerardo Rosas González**  
Director de Fortalecimiento Institucional

En seguimiento al oficio número: 511/2023-0913-37 signado con fecha 17 de febrero de 2023 y por instrucciones de la Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Universidad de la Cañada; por este conducto me permito remitirle el informe de avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2023, correspondiente al trimestre abril-junio, con fecha de corte 3º junio de 2023, debidamente requisitado y digitalizado en formato PDF con su respectivo archivo en Excel.


Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formatos Excel y PDF, a los correos: rocioc@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

*“praeteritum noscere, posterum molior”*

  
**L.C.E. Alfonso Martínez López**  
Vice-Rector de Administración



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

Con copia para:

- Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias.- Rectora de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
- Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento.
- M.A. Magaly Nictexa Fierro Muñoz.- Representante Institucional UNCA.- Mismo fin.
- I.E. Armando Marín Nieto.- Encargado del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.
- Archivo.

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Cañada  
Entidad federativa: OAXACA  
Clave B11: 200800029


Nombre: LIC. ALFONSO MARTINEZ LOPEZ  
Cargo: VICE RECTOR DE ADMINISTRACION  
Teléfono: 0236 372 07 15, Ext: 200  
Correo electrónico: vic\_r\_a@unca.edu.mx

Nombre: ING. ARMANDO MARIN NIETO  
Cargo: ENC. DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO  
Teléfono: 0236 372 07 15, Ext: 200  
Correo electrónico: supervision-dpa@unca.edu.mx


DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA


Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto Observaciones Obra construida Ejecuciones Análisis y Vigilancia Mantenimiento Proyecto construido	Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCION DE LA OBRA						Monto ejecutado (D)	Resumen (E) P-D	Espacios físico-requisito (programa/subcontrato)			Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas Reales		Observaciones	Reintegro a la TESOFE			Actas																
				No. (s) de Contrato (s)	Fecha Programada		Monto Contratado (B)	Condiciones	Monto no Contratado (C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B			Metros Cuadrados	Cantidad	Metros Cuadrados			Inicio	Termino		Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	Entregables (Acta Físico) MONTO	Fecha	Acta Administrativo de Entrega- Recepcion (Forma OGE/S) MONTO	Fecha													
					INICIO	TERMINO																					Observaciones	Observaciones	Observaciones										
								GLOBAL DEL PROYECTO																															
1	TERMINACIÓN DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	X	\$ 2,460,214.00						\$ 2,460,214.00			0.00%																											
2	TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X	\$ 2,069,290.00						\$ 2,069,290.00			0.00%																											



OBRAS  
ING. ARMANDO MARIN NIETO  
ENC. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO



ING. ALFONSO MARTINEZ LOPEZ  
VICE RECTOR DE ADMINISTRACION



RECTORIA  
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ABAS

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

2023



ESQUEMA FORMAL EN EL QUE SE OTORGAN EL RECURSO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tiempo y 2do día de mes

ABRIL-JUNIO

Fecha de elaboración: 04/07/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Cañada  
Entidad federativa: OAXACA  
Clave SI: 20MS00327

Nombre: L.C.F. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
Cargo: VICE RECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Teléfono: (296) 372 07 15, Ext.: 200  
Correo electrónico: vica\_admin@unca.edu.mx


Nombre: ING. ARMANDO MARTÍN NIETO  
Cargo: ING. DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
Teléfono: (296) 372 07 15, Ext.: 200  
Correo electrónico: supervision-obras@unca.edu.mx

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Presupuesto	Ejecución	Avance	RESPONSABLES			Obras y Mantenimiento							
									Área de procesamiento del agua	Área de Insumos	Área de Operaciones								
3	CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X		\$ 2,543,189.00	\$ 2,543,189.00	\$	\$		1	38.78	1	4.71	1	63.19	TOTAL	3	106.68	0.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO OFICIO DE AUTORIZACION
5	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE DOCENCIA Y SALAS DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X		\$ 2,843,555.00	\$ 2,843,555.00	\$	\$		2		2		1		TOTAL	10	0.00	0.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO OFICIO DE AUTORIZACION
				\$10,896,237.00	\$10,896,237.00	\$0.00	\$0.00												



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

ING. ARMANDO MARTÍN NIETO  
ING. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

L.C.F. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

RECTORA  
NITIA MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ABAS

1 Se capturan los aspectos que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar fotos como sea necesario.  
2 En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd/mm/aa.



2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUNAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

ABRIL-JUNIO/2023

Fecha de elaboración: 04/07/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRICIDAD: 1 Nombre de la obra: **TERMINACIÓN DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tittlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.




Porcentaje de avance  
**0.00%**

FOTOS




F1: TERMINACIÓN

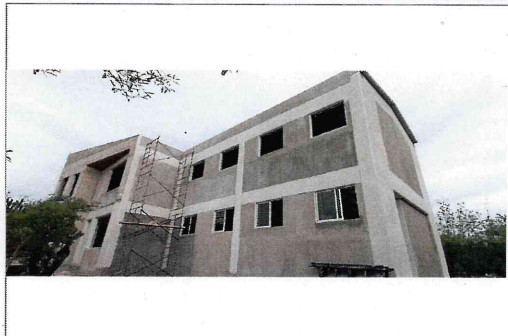


F2: TERMINACIÓN

Observaciones:  
**EN PROCESO ADMINISTRATIVO**

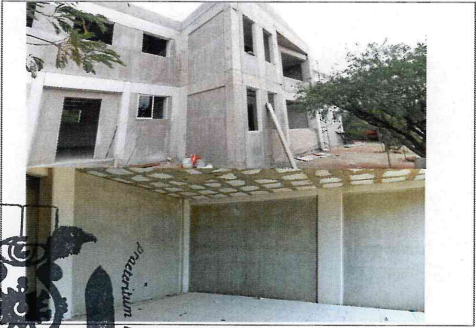

F3: TERMINACIÓN

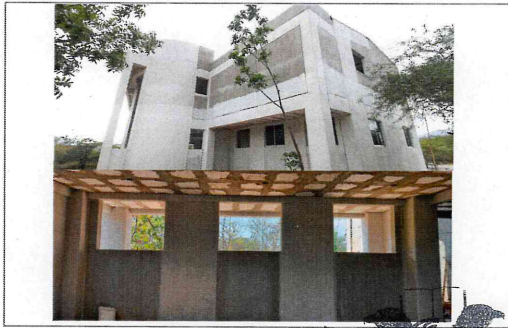

F4: TERMINACIÓN



F5: TERMINACIÓN

OBRAS  
ING. ARMANDO MARIN NIETO  
INC. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, COSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

TERMINACIÓN  
LIC. RAFAEL MARIJNEZ LOPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

RECTORA  
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARAS.

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. El contenido y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

ABRIL-JUNIO/2023

Fecha de elaboración: 04/07/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0.00%


PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

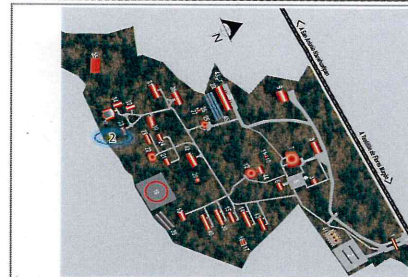

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS




F1: TERMINACIÓN

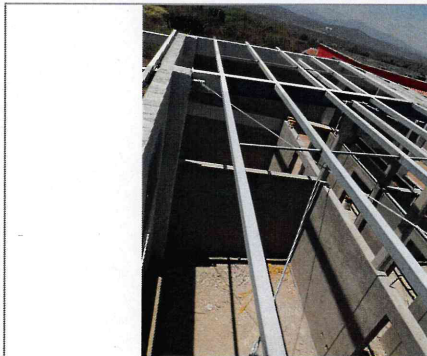


F1: TERMINACIÓN

Observaciones :


EN PROCESO ADMINISTRATIVO

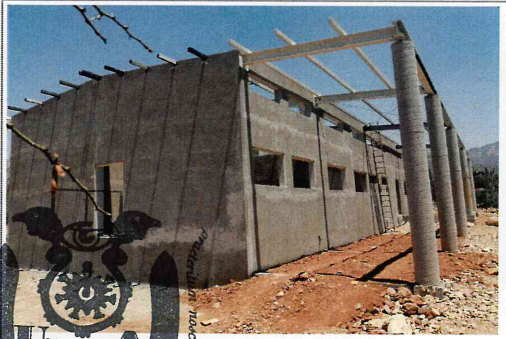

F1: TERMINACIÓN

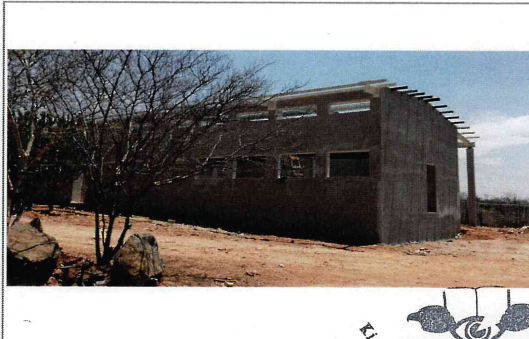

F1: TERMINACIÓN

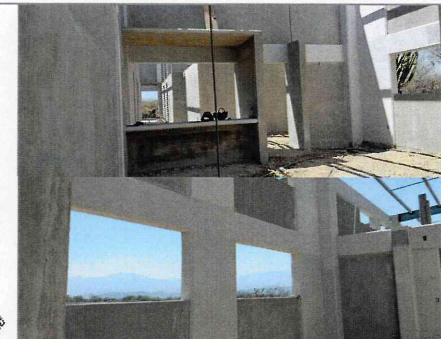

E1: TERMINACIÓN

OBRAS

ING. ARMANDO MARIN NIETO  
ENC. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, COSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

CONDUCCIÓN

L.C. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

RECTORA

MTRA. MARIA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS.

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA



2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL REDUJO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

ABRIL-JUNIO/2023

Fecha de elaboración: 04/07/2023


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD: 3 Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

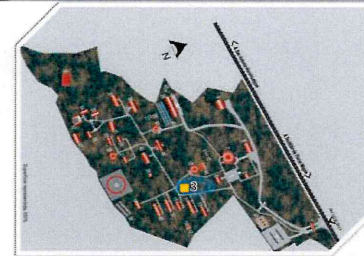

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS



F1: TERMINACIÓN



F1: TERMINACIÓN

Observaciones:  
**EN PROCESO ADMINISTRATIVO**



F1: TERMINACIÓN

OBRAS  
ING. ARMANDO MARIN NIETO  
ENC. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.





F1: TERMINACIÓN

ING. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



F1: TERMINACIÓN

RECTORA  
MTRA. MARIA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIZA



Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Durante el desarrollo y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

ABRIL-JUNIO/2023

Fecha de elaboración: 04/07/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIOIRIDAD 5

Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE DOCENCIA Y SALAS DE CÓMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.



Universidad de la Cañada


Porcentaje de avance

0.00%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

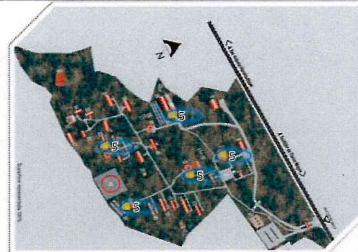


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: TERMINACIÓN



F1: TERMINACIÓN


Observaciones:



F1: TERMINACIÓN



F1: TERMINACIÓN





F1: TERMINACIÓN

OBRAS  
ING. ARMANDO MARÍN HERNÁNDEZ  
ENC. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

COORDINADOR  
ING. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
ENC. DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

RECTORA  
MTA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.



Este reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA
