



Universidad de la Cañada

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA RECTORÍA

"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN"

Oficio No.: REC/80/2026.

Asunto: Entrega de informe del FAM 2025 correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2026.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 15 de abril de 2026.

Mtra. Cinthya Ruano Méndez

Directora de Fortalecimiento Institucional

Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural

Secretaría de Educación Pública

Presente:

En mi calidad de Rectora de la Universidad de la Cañada y dando seguimiento al oficio número: 511/2025-0575-42 de fecha 18 de febrero de 2025; por este conducto me permito remitirle el informe de avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2025, correspondiente al trimestre enero-marzo con fecha de corte 31 de marzo de 2026.

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formatos Excel y PDF, a los correos: **dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx**, **sconde@nube.sep.gob.mx**,
cynthia.ruano@nube.gob.mx, **claudia.duenas@nube.sep.gob.mx**,
andrea.rangel@nube.sep.gob.mx, **ppichardo@nube.sep.gob.mx** y
jcardona@nube.sep.gob.mx.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

"praeteritum noscere, posterum mori"

Dra. Margarita Bernabé Pineda
Rectora de la Universidad de la Cañada
rectoria@unca.edu.mx
236 372 0747 Ext. 101



RECTORÍA

Con copia para:

L.C.E. Eugenio Cortes Hernández.- Vice-Rector de Administración.- Para su conocimiento y seguimiento.

I.C. Armando Marín Nieto.- Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento UNCA.- Mismo fin.

Archivo.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Cañada
Entidad Federativa: OAXACA
Clave PFI: 20MSU0032V

Planeación

Titulares de Área

Obras y Mantenimiento

Nombre: L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Teléfono: (238) 372 07 15, Ext.: 200
Correo electrónico: vice_admin@unca.edu.mx

Nombre: ING. ARMANDO MARÍN NIETO
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Teléfono: (238) 372 07 15, Ext.: 208
Correo electrónico: supervision-obras@unca.edu.mx


DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Contrato y calendario de ejecución de la obra, Remanentes, Espacios físicos/equipamiento, Acciones que sustentan el avance, Fechas Reales (DD/MM/AA), Observaciones, Reintegro a la TESOFE, Actas.

Signature of Armando Marín Nieto

OBRAS
ING. ARMANDO MARÍN NIETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO




Signature of Margarita Bernal Pineda



Universidad de la Cañada
RECTORÍA

Signature of Eugenio Cortés Hernández

PLANEACIÓN
L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todos en dos dígitos: dd, mm y aa.

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIMORDIAL 1 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS
		 Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

100.00%

FOTOS



Sistema de Aire Acondicionado 5,000 Btu'S (7 pzas)



Incubadora Digital (1 pza)

Observaciones :

CONCLUIDO



Mesa Antivibratoria para Balanza (1 pza)



Autoclave Portatil Para Gas (2 pzas)



Parrilla de Calentamiento con Agitación (4 pzas)



OBRAS

ING. ARMANDO MARÍN NIETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

RECTORÍA

DR. MARGARITA BERNABÉ HERNÁNDEZ

PLANACIÓN

L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Es importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

Universidad de la Cañada
RECTORÍA

Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



Trimestre y año que se reporta:

Enero - Marzo - 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD: 1 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS
		 Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

100.00%

FOTOS

 Cama de Hospital Manual (1 pza)	 Balanza de Precisión (1 pza)	Observaciones: CONCLUIDO
 Agitador Magnético Digital (3 pzas)	 Impresora 3D (1 pza)	
		 Prensa Automática para Extraer Aceites (1 pza)



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

OBRAS


ING. ARMANDO PINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

RECTORIA

DR. MARGARITA BEINABÉ PINO

PLANESACION

L.C.E. EUGENIO CORTES HERNÁNDEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN







NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.


Universidad de la Cañada
RECTORÍA

Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

REPORTÉ FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Universidad de la Cañada Porcentaje de avance 100.00%	PRIORIDAD: 1 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	

FOTOS		Observaciones : CONCLUIDO
 Molino Pulverizador (1 pza)	 Refrigerador para Alimentos (1 pza)	

 Switch Administrable Capa 3 con 24 Puertos (2pzas)	 Switch Administrable Capa 3 con 48 Puertos (1 pza)	
--	---	--

OBRAS
 ING. ARMANDO HERNÁNDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

PLANEACIÓN
 DRA. MARGARITA BERNABÉ PINEDA

PLANEACIÓN
 L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Universidad de la Cañada
 VICE-RECTORÍA DE
 ADMINISTRACIÓN

NOTA:
 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

Universidad de la Cañada
 RECTORÍA

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestro y año que se reporta

Enero - Marzo - 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTÉ FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Universidad de la Cañada Porcentaje de avance 100.00%	PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Tittlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.
---	--	---	---	---

FOTOS

 Torniquetes (4 pzas)	 Mesa para Cafetería (40 pzas)	 Silla para Mesa de Cafetería (162 pzas)	Observaciones : CONCLUIDO
---	--	---	------------------------------


 Estufon Industrial (1 pza)	 Silla para Mesa de Cafetería (162 pzas)
---	---


Universidad de la Cañada
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

OBRA:
 ING. ARMANDO MANU NIEGO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, COSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.

DIRECTORA:
 DRA. MARGARITA BERNABE POMEY

PLANIFICACIÓN:
 L.C.E. EUGENIO CORTES HERNÁNDEZ
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN


Universidad de la Cañada
 VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada
 RECTORÍA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Enero - Marzo - 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Universidad de la Cañada Porcentaje de avance 100.00%	PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Desecador (3 pzas)



Incubadora con Agitación Orbital (1 pza)

Observaciones :

CONCLUIDO




Deshidratador (1 pza)



Modelo Anatómico de Torsio Masc. 85cm (2 pzas)



Balanza Analítica 220g X 0.0001g (6 pzas)



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

NOTA: Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

OBRAS
ING. ARMANDO MARÍN NIETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, COSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

RECTORIA
DRA. MARGARITA BERNABÉ PINEDA
UNCA

PLANEACIÓN
L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada
RECTORÍA

Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestro y año que se reporta

Enero - Marzo - 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Universidad de la Cañada Porcentaje de avance 100.00%	PROYECTO: 1 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titiacuattila, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.
---	--	---	---	--

FOTOS

 Maniqui para Intubación/Nutrición (1 pza)	 Cámara de Clima Constante (1 pza)	Observaciones : CONCLUIDO
--	--	------------------------------


Universidad de la Cañada
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

OBRAS
 ING. ARMANDO GARCÍA PINO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

RECTORA
 DRA. MARGARITA BERNABÉ PINEDA

PLANEACIÓN
 L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

NOTA:
 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

Universidad de la Cañada
 RECTORÍA

Universidad de la Cañada
 VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Enero - Marzo - 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRECEDENCIA 2

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

100.00%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiltlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

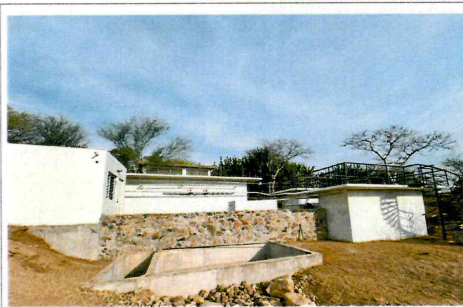

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR

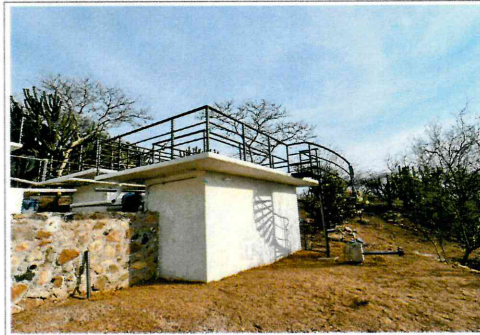

Sedimentador 2

Observaciones :

CONCLUIDO



Barandales



Cuarto de Máquinas



Instalaciones



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

NOTA:

Se anexa informe que se anexa reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

OBRAS

ING. ARMANDO WARIN-NIEGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, COSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

RECTORA

DR. MARGARITA BERNADE PINEDA

PLANEACION

L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Enero - Marzo - 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIOIRIDAD 2 Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

100.00%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



Sedimentador 1 y 2



Caseta de Generación de Ozono

Observaciones :

CONCLUIDO



Concreto Sedimentador 1



Automatización



Sedimentador 1 y 2



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

NOTA: Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

OBRAS
ING. ARMANDO MARIN NIETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, COSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

RECTORÍA
DRA. MARGARITA BERNABÉ PINEDA

PLANEACIÓN
L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Enero - Marzo - 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIMORDIAL 1 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, AMPLIACIÓN DE METAS.



Porcentaje de avance

0.00%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatlla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS




DIANA ALELI MORALES HERNÁNDEZ (C36ED067-8BEE-4247-8993-8029039A319)



ELAMA MUEBLES PARA CÓMPUTO S.A. DE C.V. (866F3123-8B08-4096-922D-44207C1D1989)

Observaciones :


CONCLUIDO



ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. (36927923-4914-471b-9165-402418104756)



ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. (36927923-4914-471b-9165-402418104756)

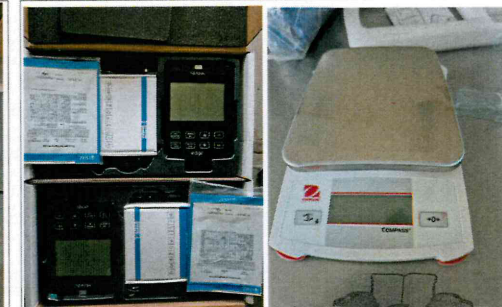

COMERCIALIZADORA MÉDICA DIAGNÓSTICA DE OAXACA S.A. DE C.V. (36927923-4914-471b-9165-402418104756)



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

NOTA:

Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

OBRAS

ING. ARMANDO MARIN NIETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN
MANTENIMIENTO.

SECTORIA

DR. MARGARITA BENABE PIEDRA

PLANEACION

L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
